




Dübendorf, Föhrlweg + Föhrlbuckstrasse Instandsetzung Strasse und Werkleitungen

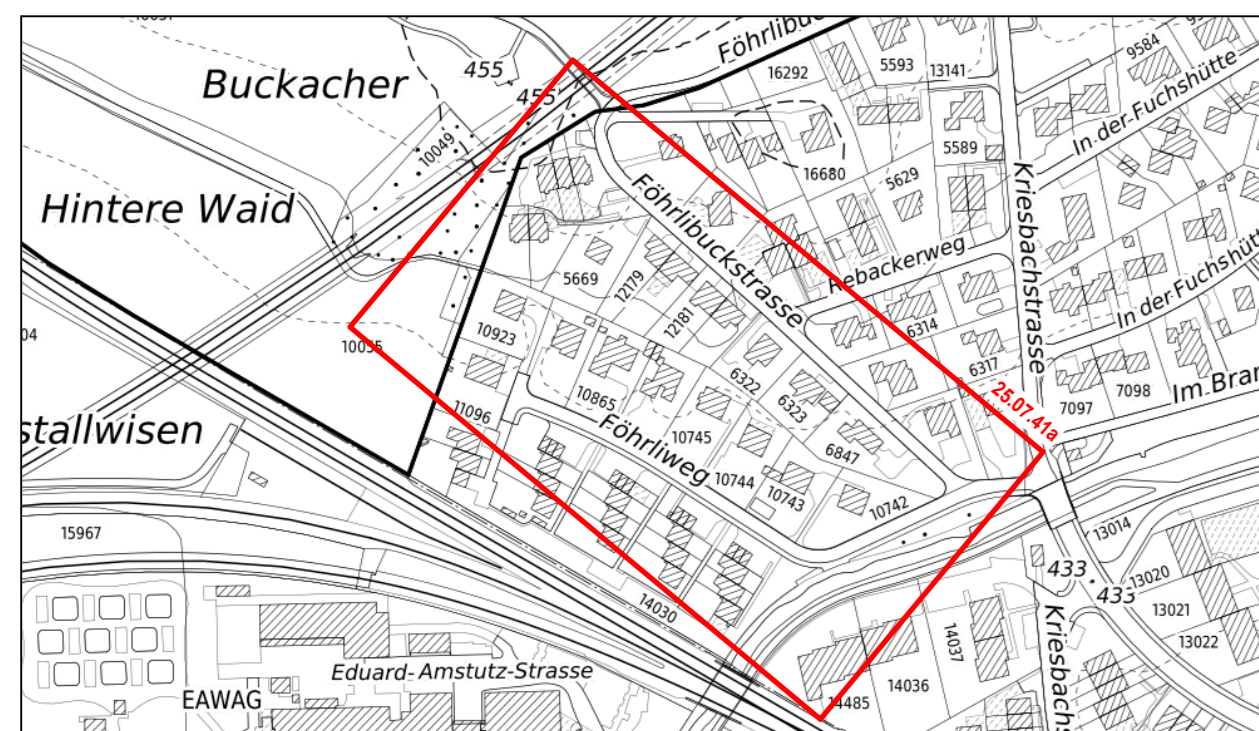

Bauprojekt Projekt Werkleitungen

Situation

Plan-Nr: 25.07.41a


Massstab: 1 : 200
Format: 80 x 126cm
Datum: 30.11.2025
Rev.: 20.02.2026
Gezeichnet: kel / ras
Visiert:




8706 Molen
Friedensstrasse 4
Telefon 044 925 30 20

6220 Birschhof
Friedensstrasse 4
Telefon 071 422 10 71

Bestehende Bodenbedeckung




Bestehende Werkleitungen

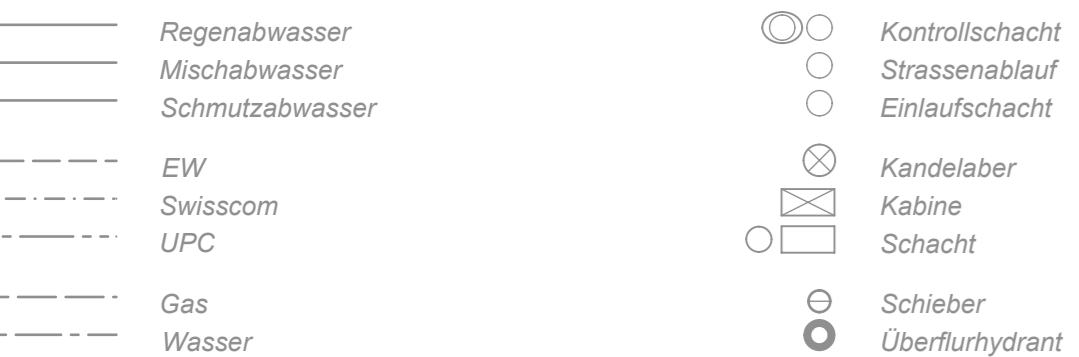

Projektierte Werkleitungen:




Werkleitungsgraben und Belagsaufbau:

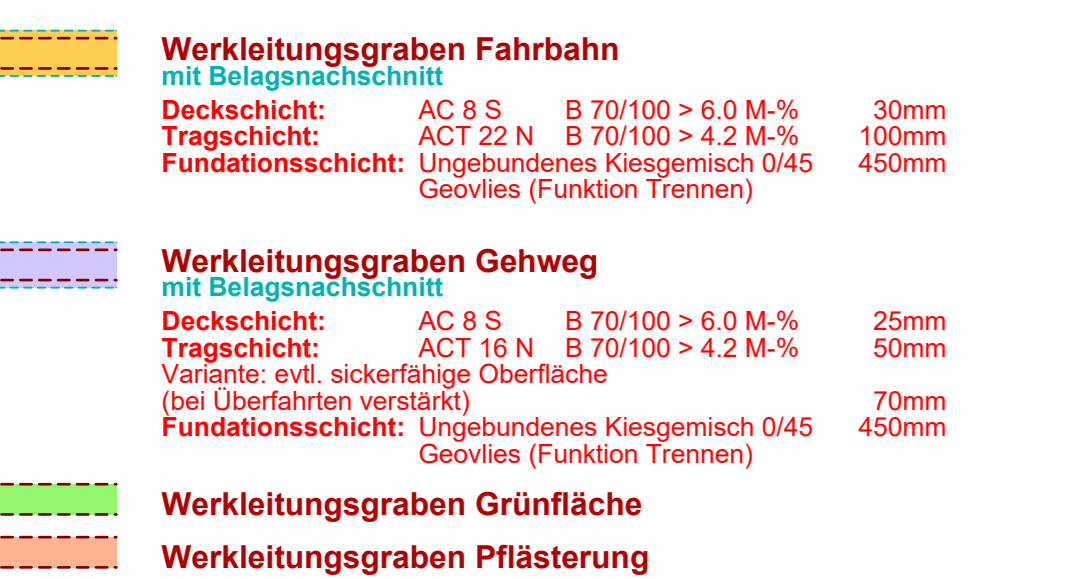

Bauzeit:

Geplanter Baubeginn: Sommer 2026
Geplantes Bauende: April 2027
Deckbeläge: Mai/Juni 2027

Sanierung der Privaten Hausanschlüsse
terminlich koordinieren mit der Innensanierung
und den Baumeisterarbeiten.
(Zu gleichen Konditionen wie die Leistungen
im Auftrag der Werke und der Stadt)

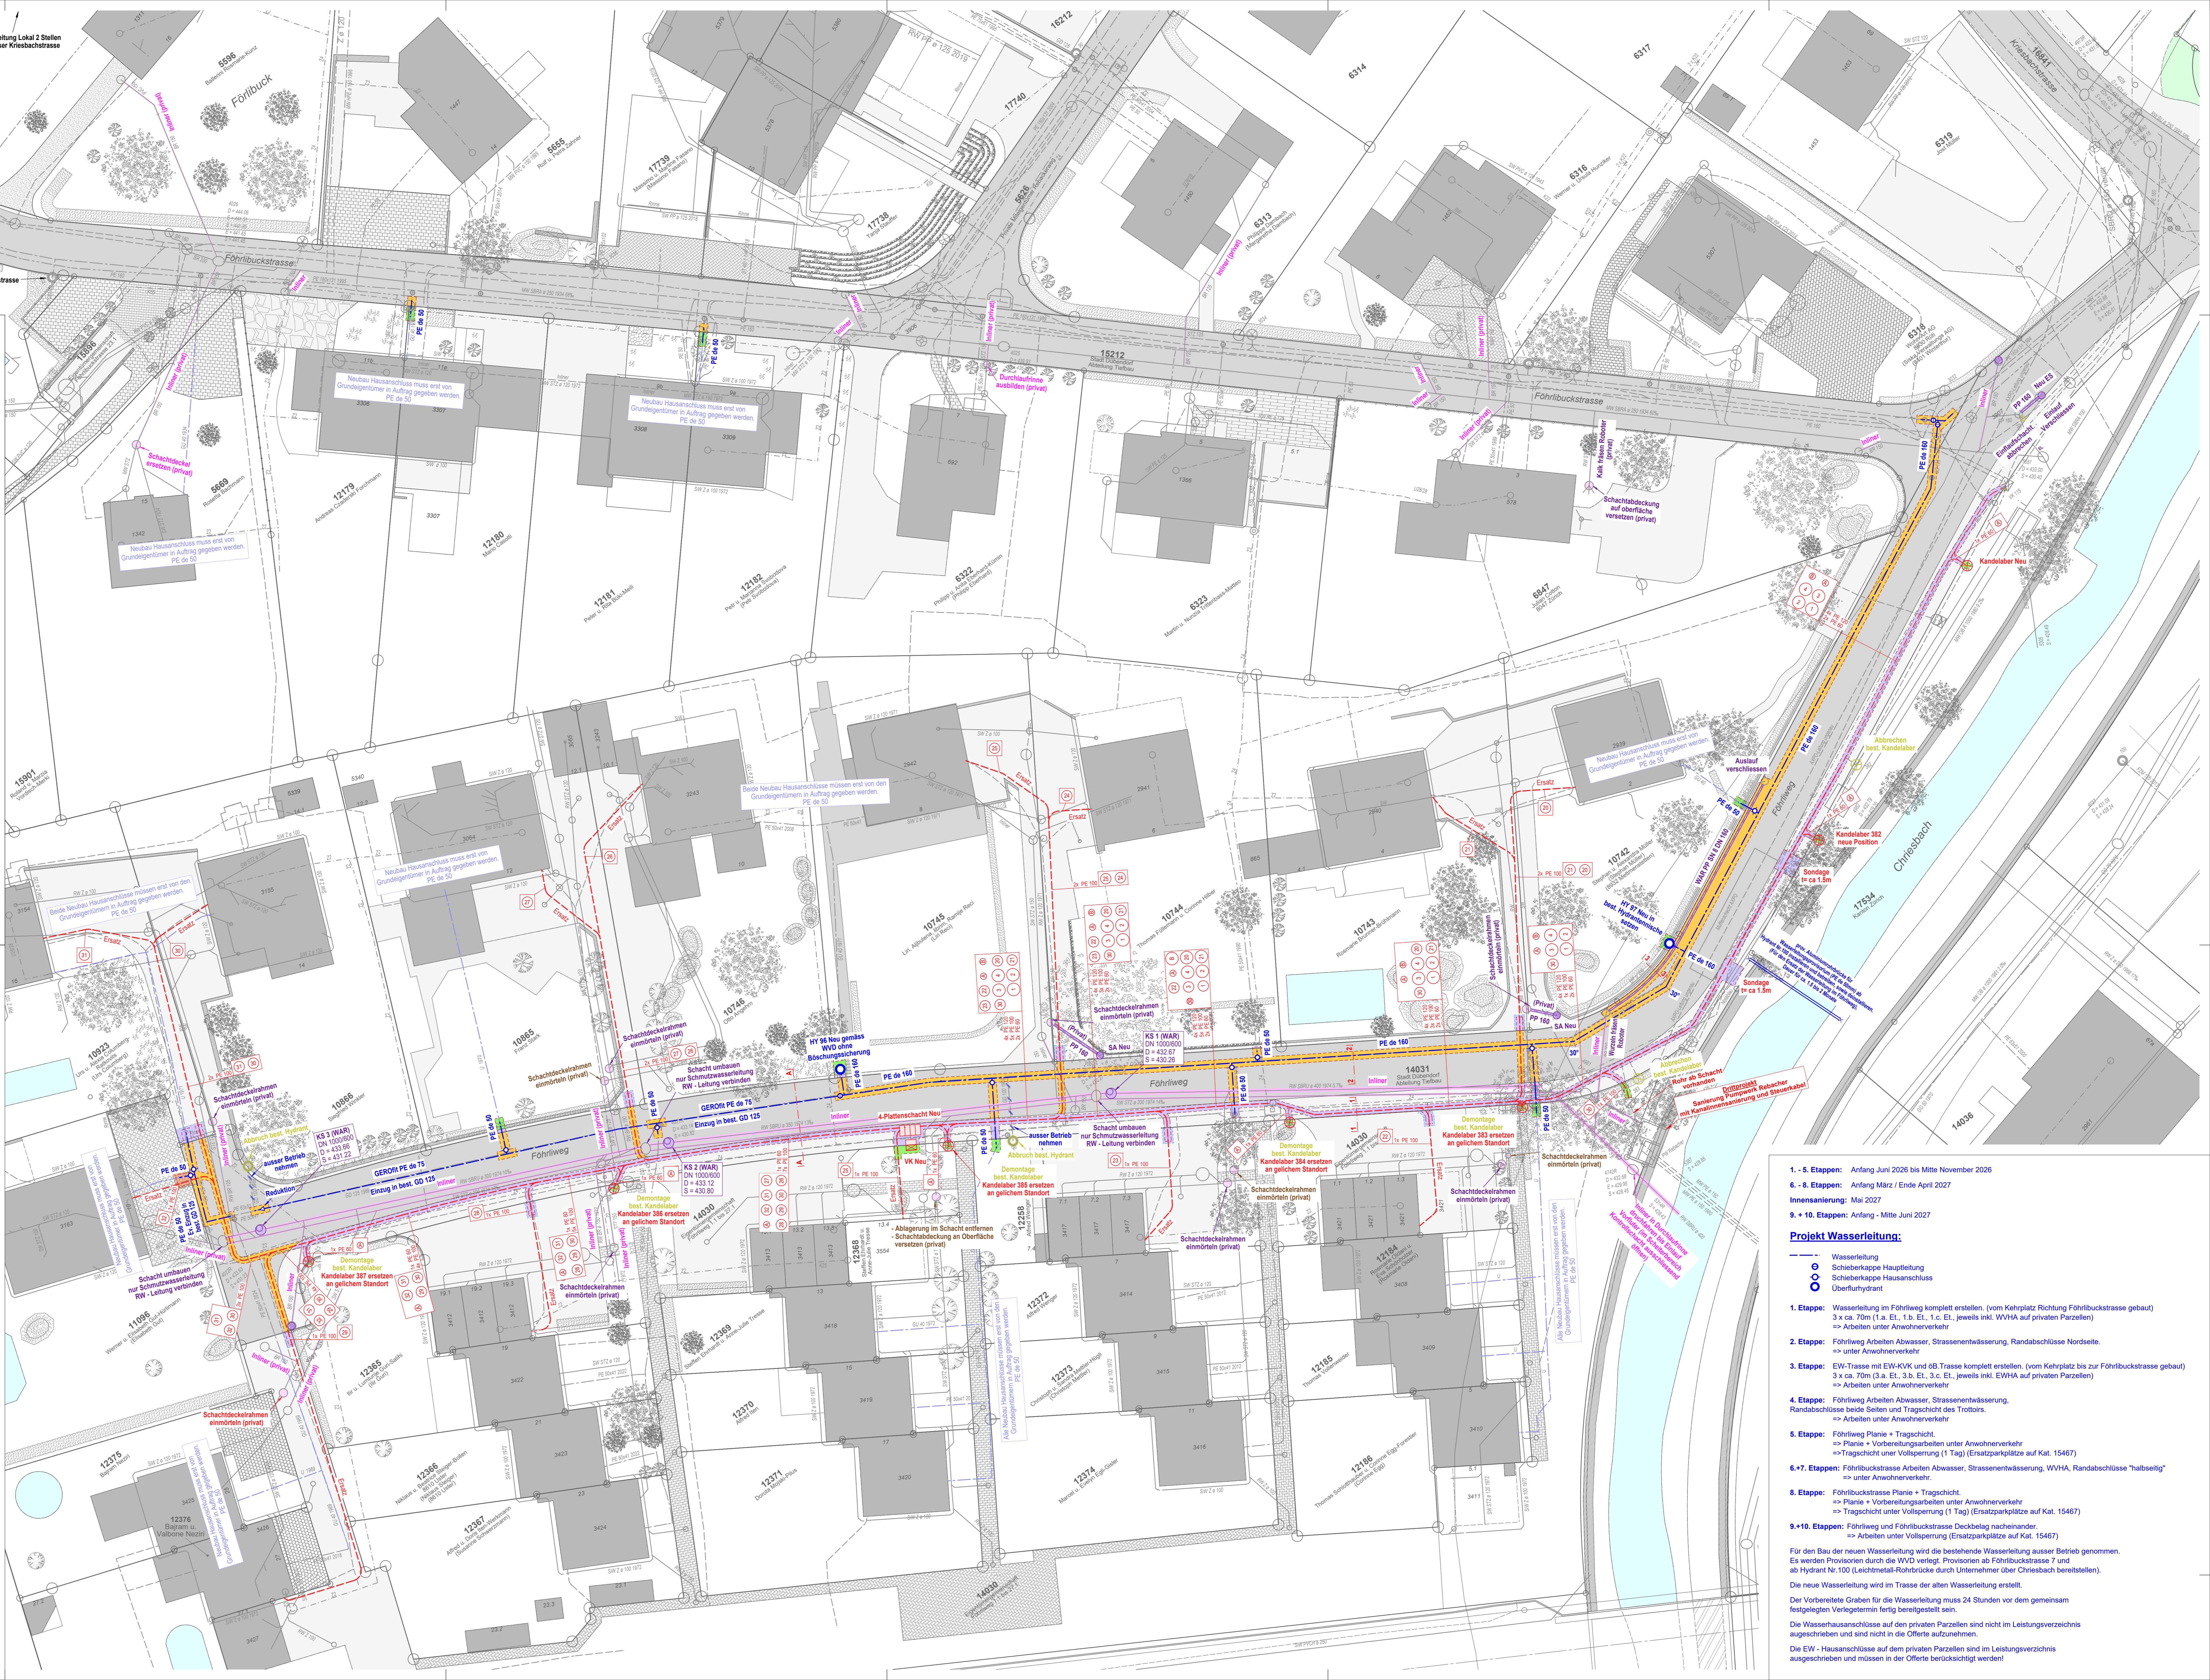

- 1. - 5. Etappen: Anfang Juni 2026 bis Mitte November 2026
 - 6. - 8. Etappen: Anfang März / Ende April 2027
 - Innensanierung: Mai 2027
 - 9. + 10. Etappen: Anfang - Mitte Juni 2027
- Projekt Wasserleitung:**
- Wasserleitung
 - Schieberkappe Hauptleitung
 - Schieberkappe Hausanschluss
 - Überflurhydrant
- 1. Etappe:** Wasserleitung im Föhrlweg komplett erstellen. (vom Kehlplatz Richtung Föhrlbuckstrasse gebaut) 3 x ca. 70m (1.a. Et., 1.b. Et., 1.c. Et., jeweils inkl. VWHA auf privaten Parzellen) => Arbeiten unter Anwohnerverkehr
 - 2. Etappe:** Föhrlweg Arbeiten Abwasser, Strassenwasserleitung, Randabschlüsse Nordseite. => Arbeiten unter Anwohnerverkehr
 - 3. Etappe:** EW-Trasse mit EW-KVK und dB Trasse komplett erstellen. (vom Kehlplatz bis zur Föhrlbuckstrasse gebaut) 3 x ca. 70m (3.a. Et., 3.b. Et., 3.c. Et., jeweils inkl. EWHA auf privaten Parzellen) => Arbeiten unter Anwohnerverkehr
 - 4. Etappe:** Föhrlweg Arbeiten Abwasser, Strassenwasserleitung, Randabschlüsse beide Seiten und Tragschicht des Trottoirs. => Arbeiten unter Anwohnerverkehr
 - 5. Etappe:** Föhrlweg Planie + Tragschicht. => Planie + Vorbereitungsarbeiten unter Anwohnerverkehr => Tragschicht unter Vollsperrung (1 Tag) (Ersatzparkplätze auf Kat. 15467)
 - 6+7. Etappen:** Föhrlbuckstrasse Arbeiten Abwasser, Strassenwasserleitung, VWHA, Randabschlüsse "halbseitig" => unter Anwohnerverkehr
 - 8. Etappe:** Föhrlbuckstrasse Planie + Tragschicht. => Planie + Vorbereitungsarbeiten unter Anwohnerverkehr => Tragschicht unter Vollsperrung (1 Tag) (Ersatzparkplätze auf Kat. 15467)
 - 9+10. Etappen:** Föhrlweg und Föhrlbuckstrasse Deckbelag nacheinander. => Arbeiten unter Vollsperrung (Ersatzparkplätze auf Kat. 15467)
- Für den Bau der neuen Wasserleitung wird die bestehende Wasserleitung ausser Betrieb genommen. Es werden Provisoren durch die VVD verlangt. Provisoren für Föhrlbuckstrasse 7 und ab Hydrant Nr. 100 (Lichtmetall-Elektrobox durch Unternehmer über Ortswachen bestellen). Die neue Wasserleitung wird in Trasse der alten Wasserleitung erstellt. Die Vorbereitende Graben für die Wasserleitung muss 24 Stunden vor dem gemeinsamen festgelegten Verlegetermin fertig bereitgestellt sein. Die Wasserhausanschlüsse auf den privaten Parzellen sind nicht im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben und sind nicht in die Offerte aufzunehmen. Die EW - Hausanschlüsse auf dem privaten Parzellen sind im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben und müssen in die Offerte berücksichtigt werden!
