


## **ANNEXE 7 : PHASAGE**

Par Dolci Architectes SA

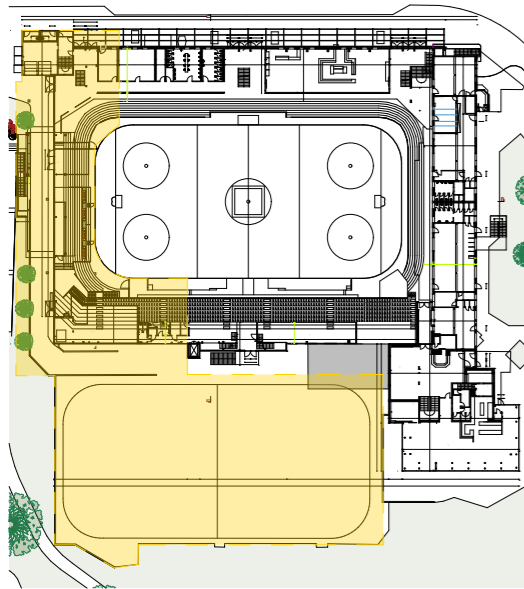


PHASE 0 Démolition Aile Nord  
Démantèlement Patinoire Extérieure

PHASE 01


**TRAVAUX AILE NORD**

Locaux Supprimés:


- Garage
- Buvette
- Loge Business
- Vestiaires première équipe

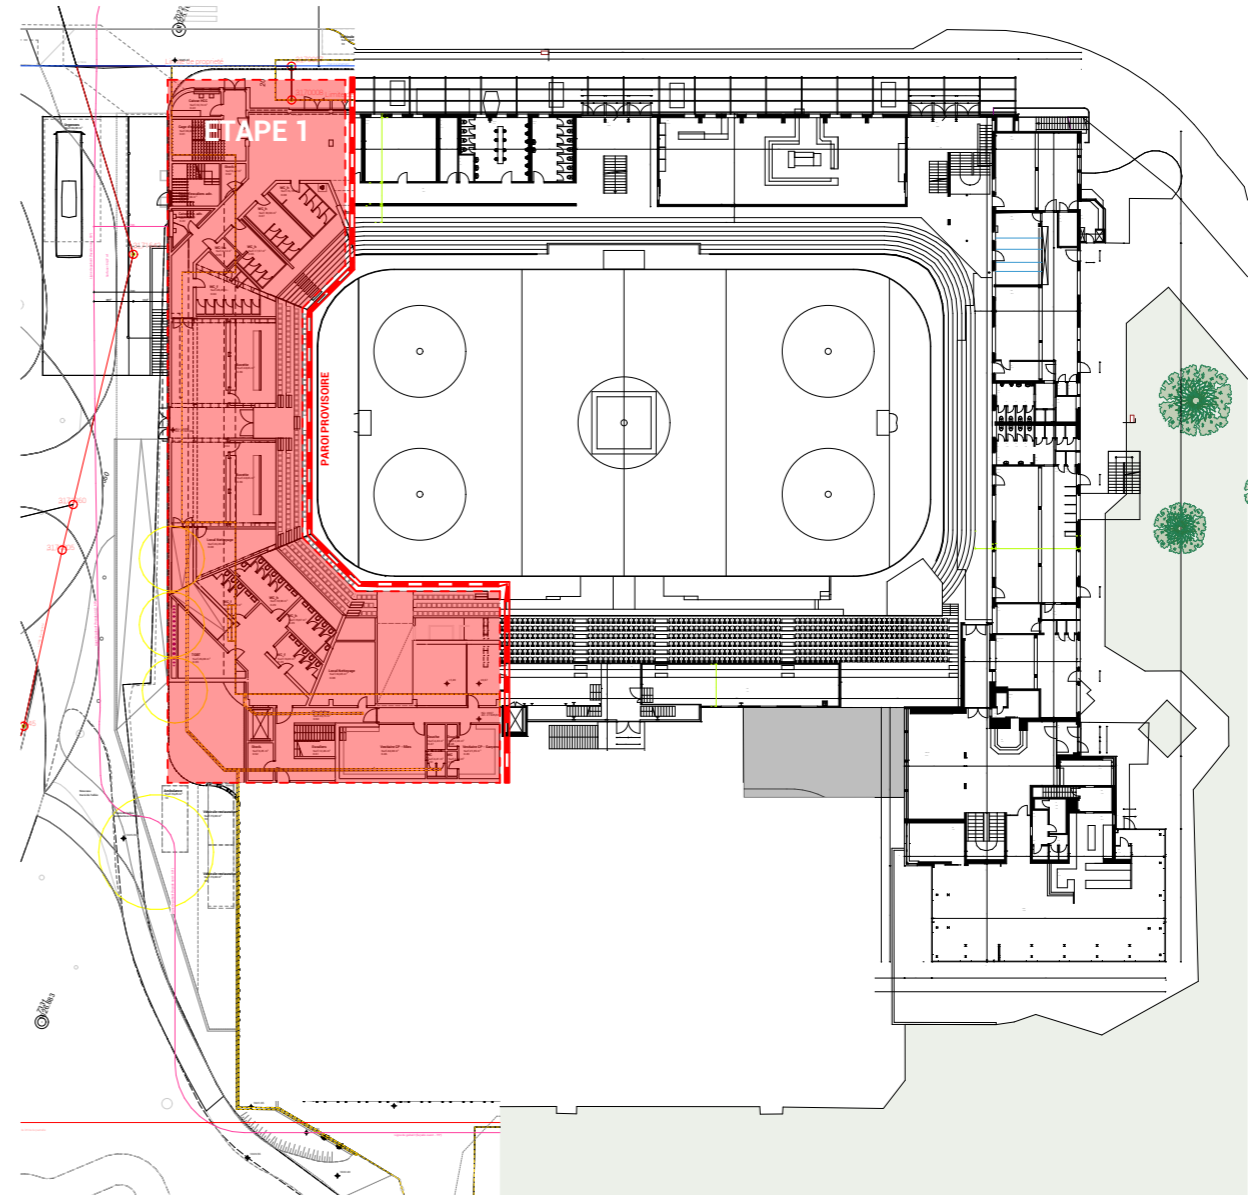


**Coupes Longitudinales**

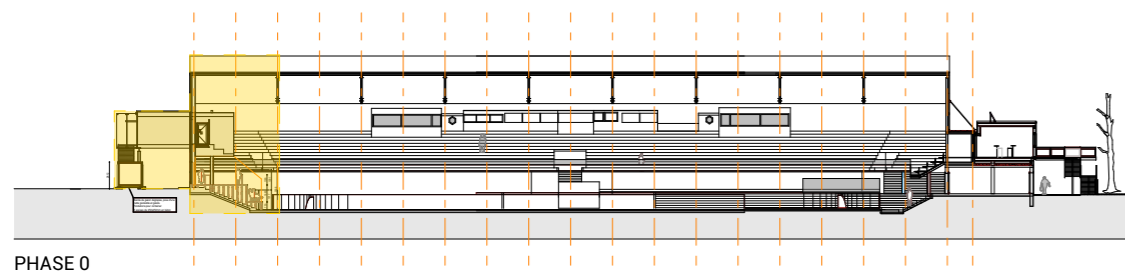

PHASE 0

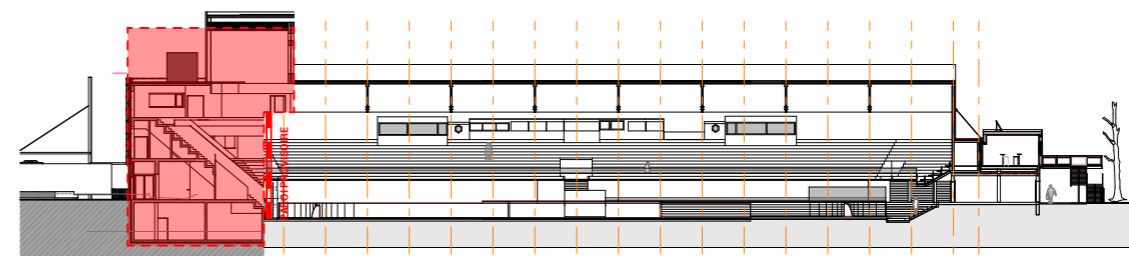

PHASE 01

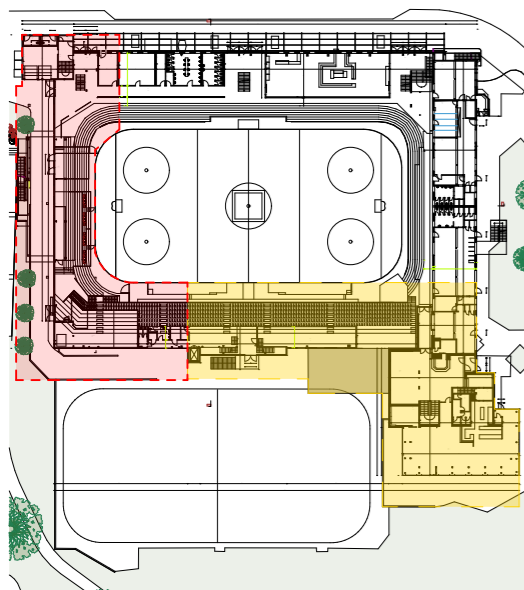

PHASE 01 Travaux Aile Nord  
Démolition Aile Ouest Restaurant

PHASE 02a


**TRAVAUX AILE OUEST - RESTO**

Nouveaux Locaux:


- Buvettes Nord
- Centrale Froid
- Local Surfaceuse
- Garage

Locaux Supprimés:


- Vestiaires NA et public
- Vestiaires visiteurs
- Local Surfaceuse
- Hall entrée
- Restaurant
- Buvette Ouest

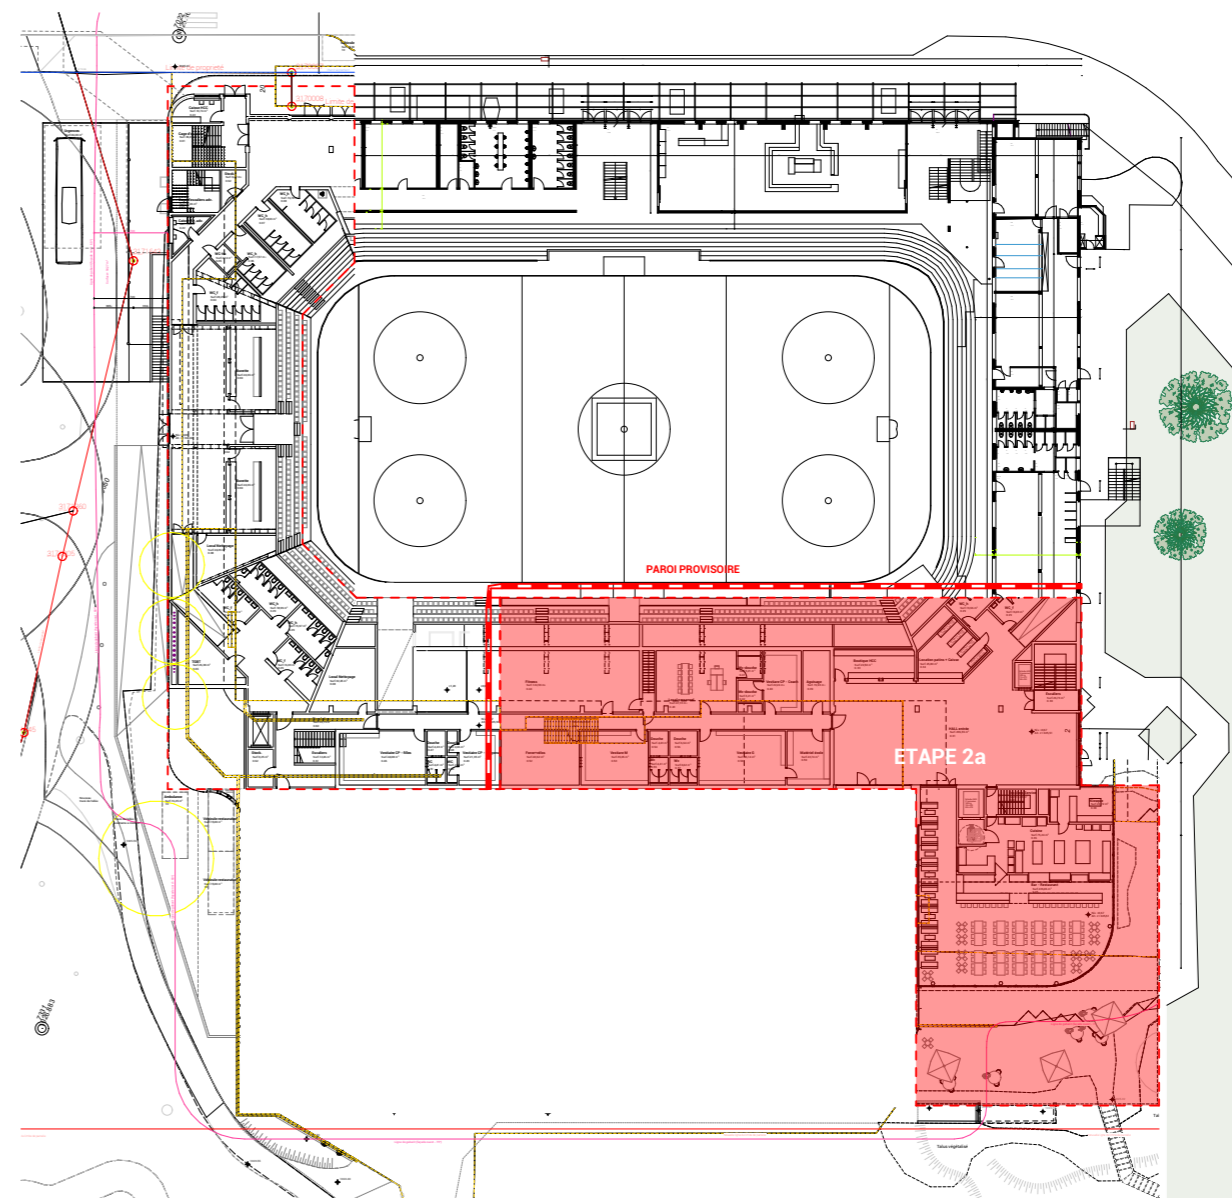


**Coupes Transversales**



PHASE 01

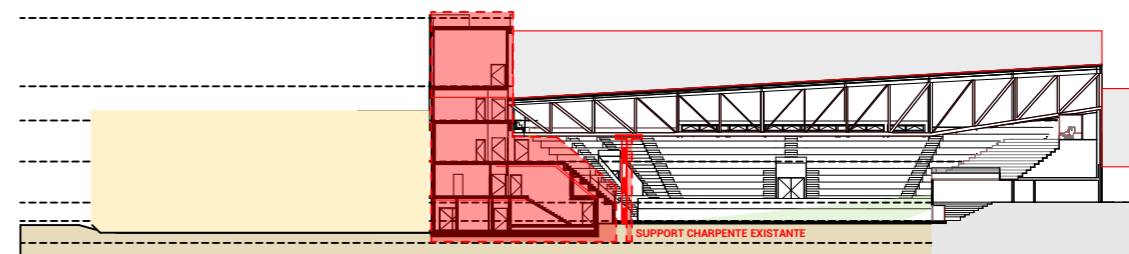

PHASE 02a

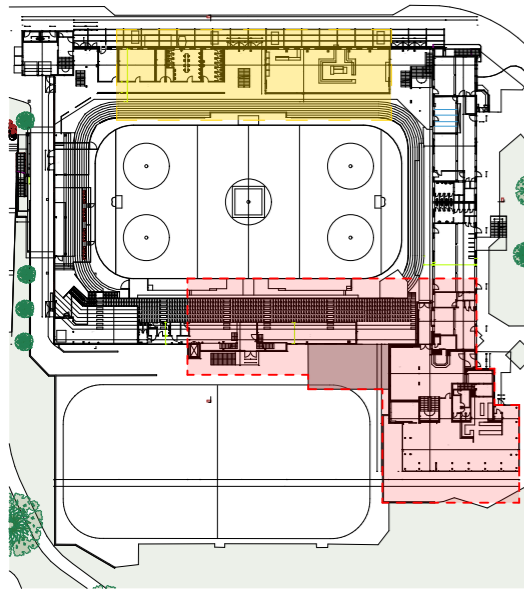


PHASE 02A Travaux Aile Ouest Restaurant  
Démolition Aile Est

PHASE 02b


**TRAVAUX AILE EST**

- Nouveaux Locaux:
- Vestiaires NA et Public
  - Vestiaires HCC
  - Vestiaires visiteurs
  - Fitness
  - Hall entrée
  - Buvette Ouest
  - Restaurant
  - Bureaux HCC
  - Goal Club
  - Loge Business


- Locaux Supprimés:
- Buvette Juniors
  - Loges Fondue
  - Presse

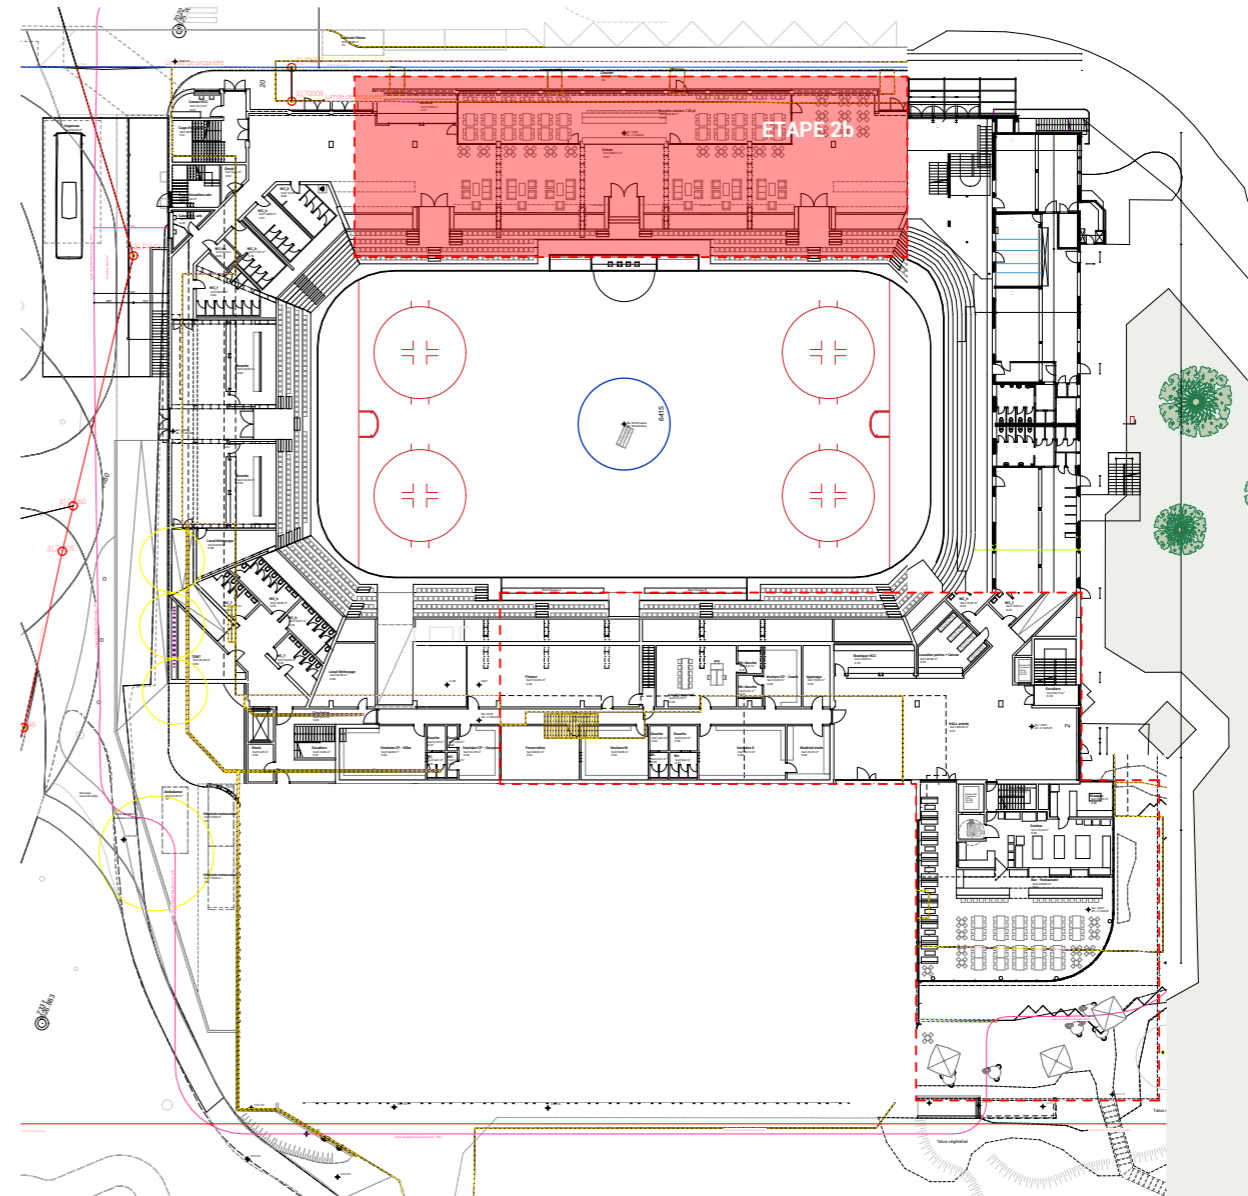

**Coupes Transversales**



PHASE 02a

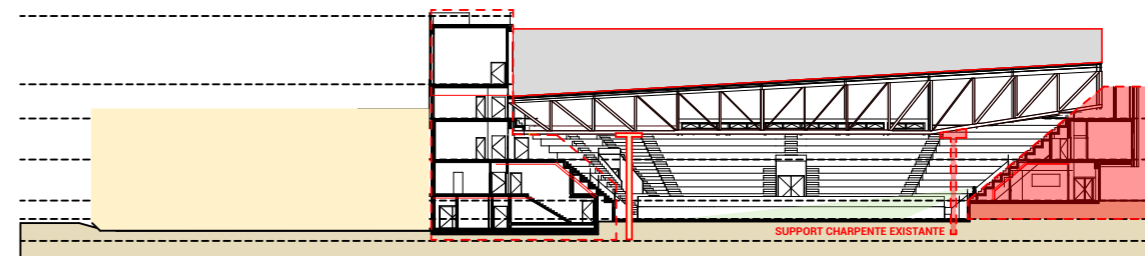

PHASE 02b

PHASE 03


## TRAVAUX TOITURE

Nouveaux Locaux:


-

Locaux Supprimés:


-

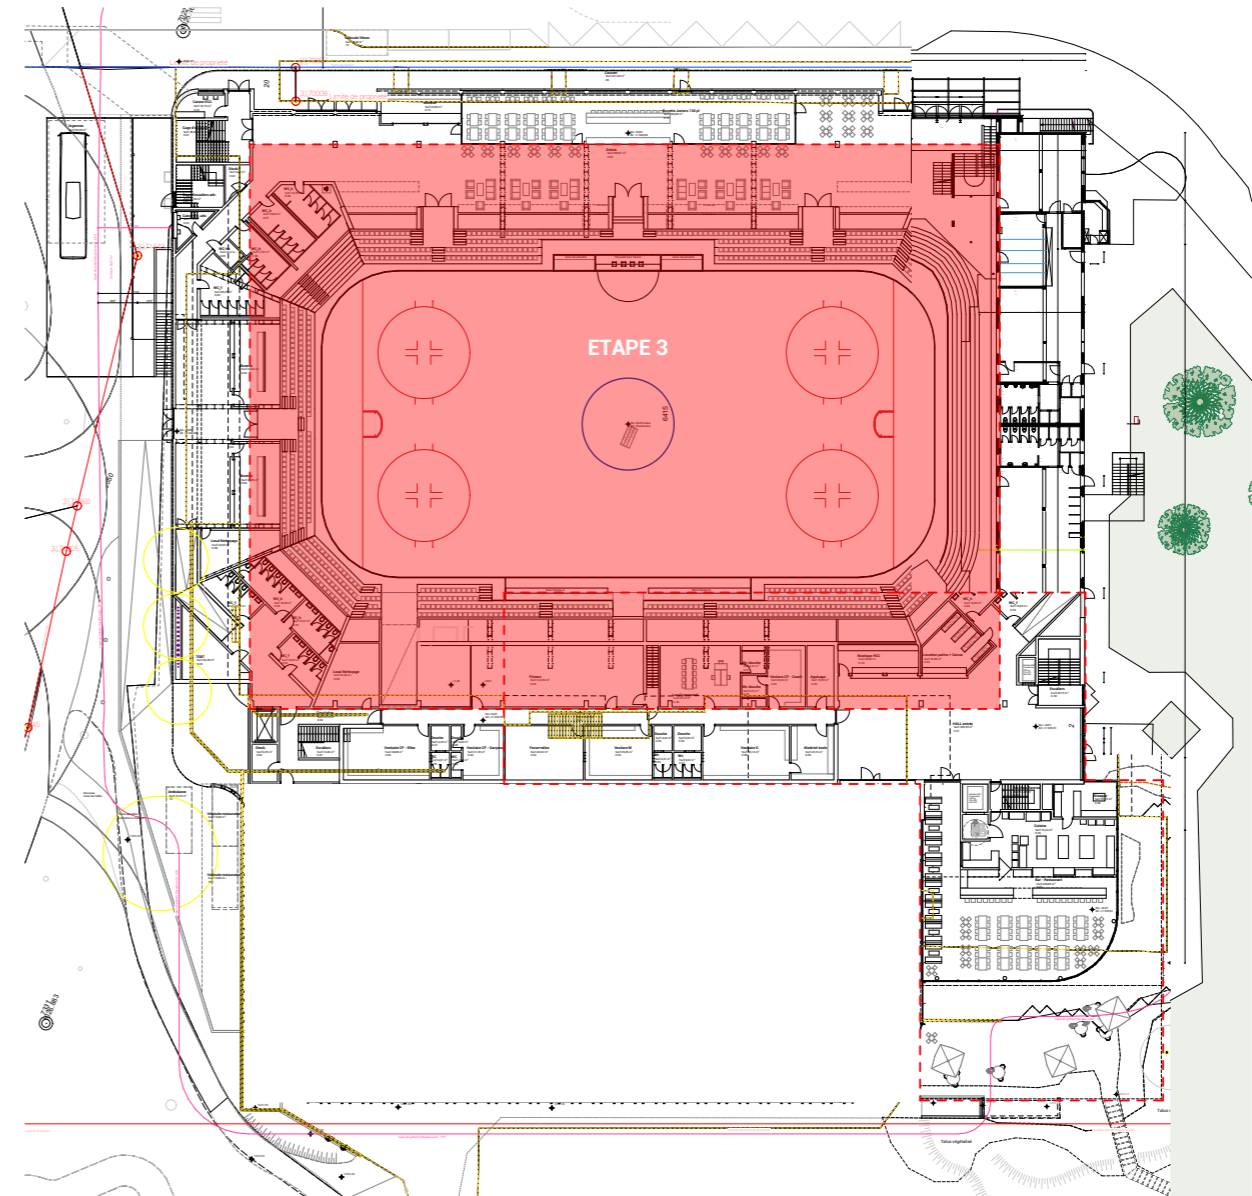


## Coupes Transversales



PHASE 03

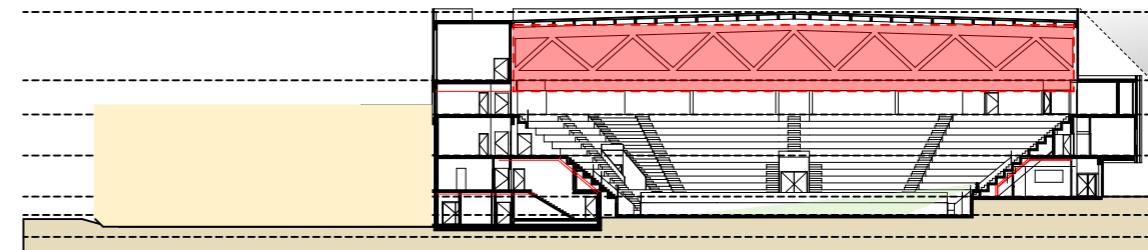

PHASE 03

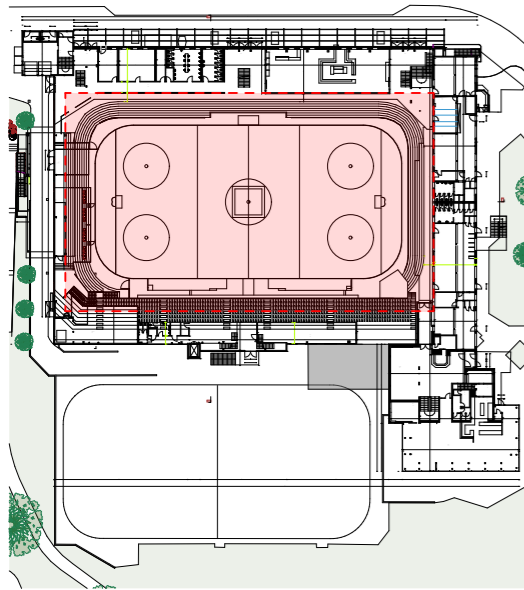

PHASE 03 Démolition et travaux Toiture


PHASE 04

**TRAVAUX PAT SECONDAIRE**


- Nouveaux Locaux:
- Buvette Juniors
  - Buvettes Est
  - Hébergement
  - Loges Fondue
  - Presse

Locaux Supprimés:


- 

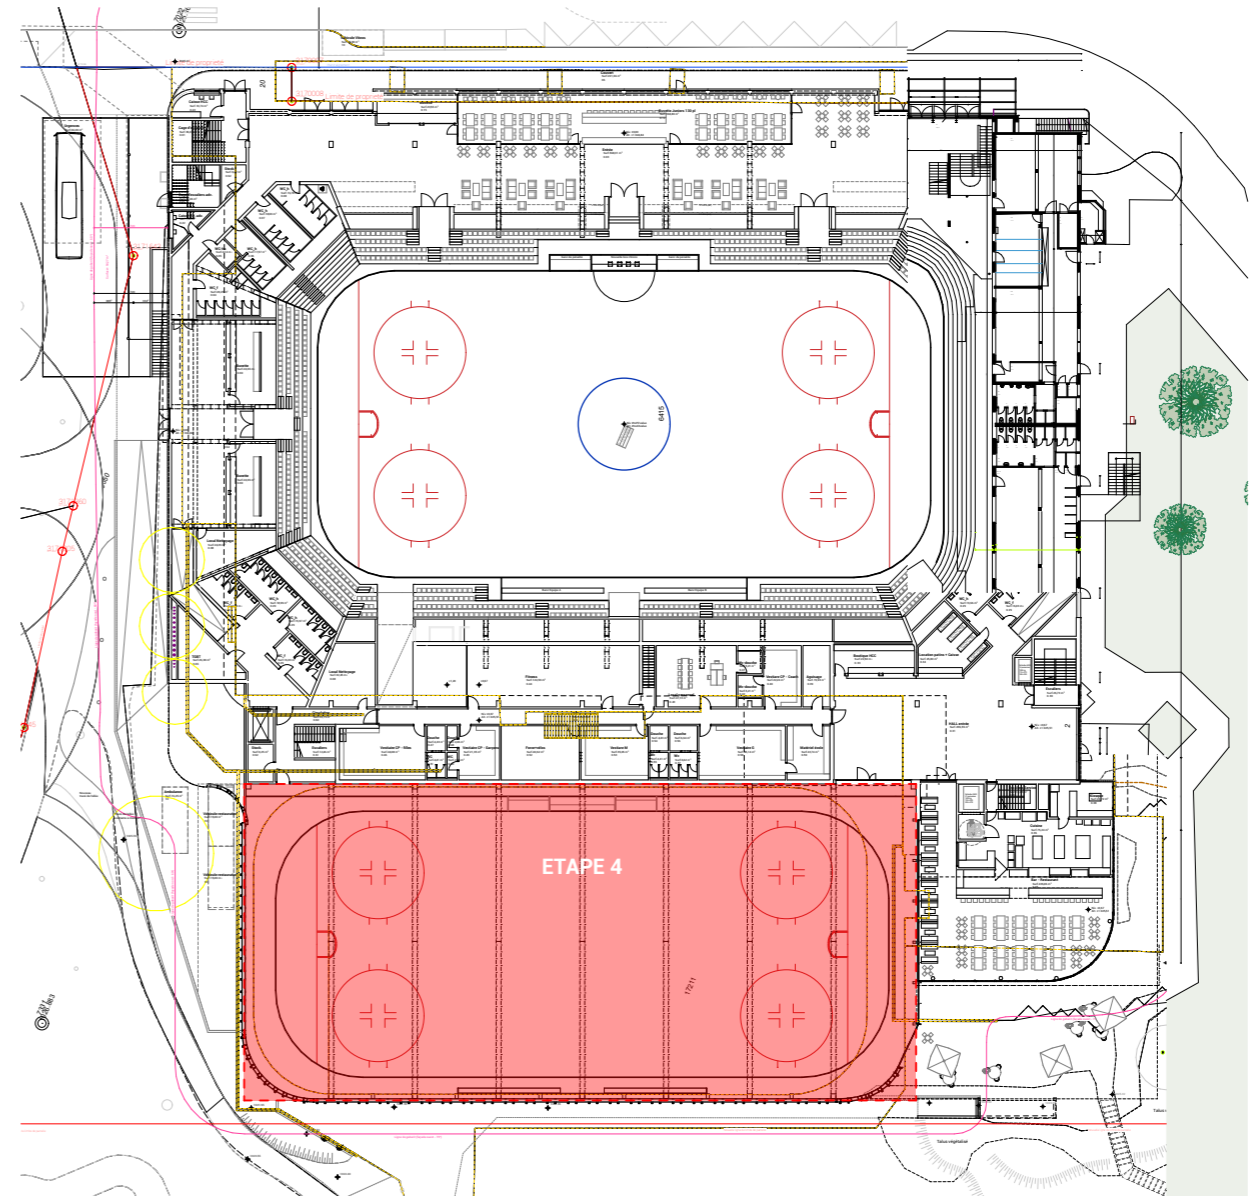


**Coupes Transversales**

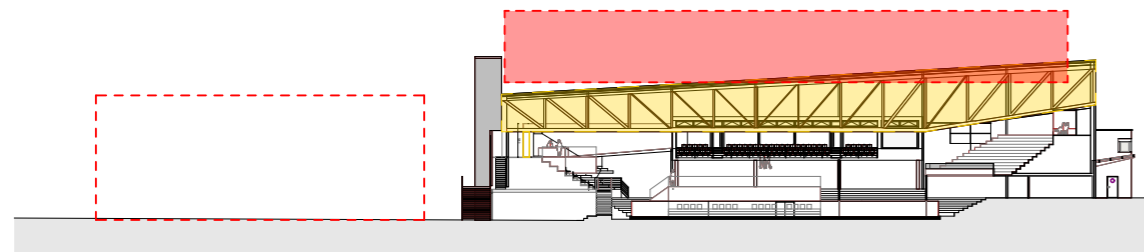

PHASE 03

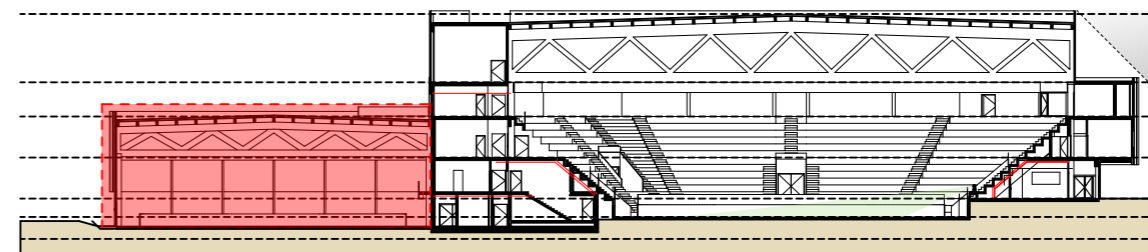

PHASE 04

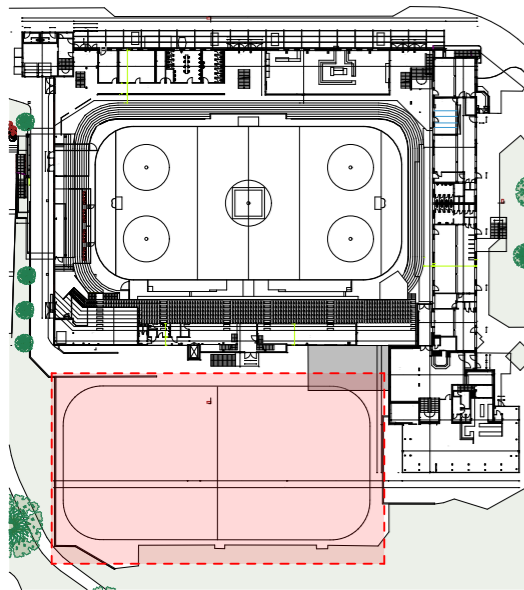

PHASE 04 Travaux Patinoire Secondaire

PHASE 05

**DEMOLITION AILE SUD**

Nouveaux Locaux:

-

Locaux Supprimés:

- Centrale Froid
- Vestiaires
- Fitness
- Goal Club

PHASE 06


**TRAVAUX AILE SUD**

Nouveaux Locaux:


- Buvettes Sud
- Terrasse

Locaux Supprimés:


-

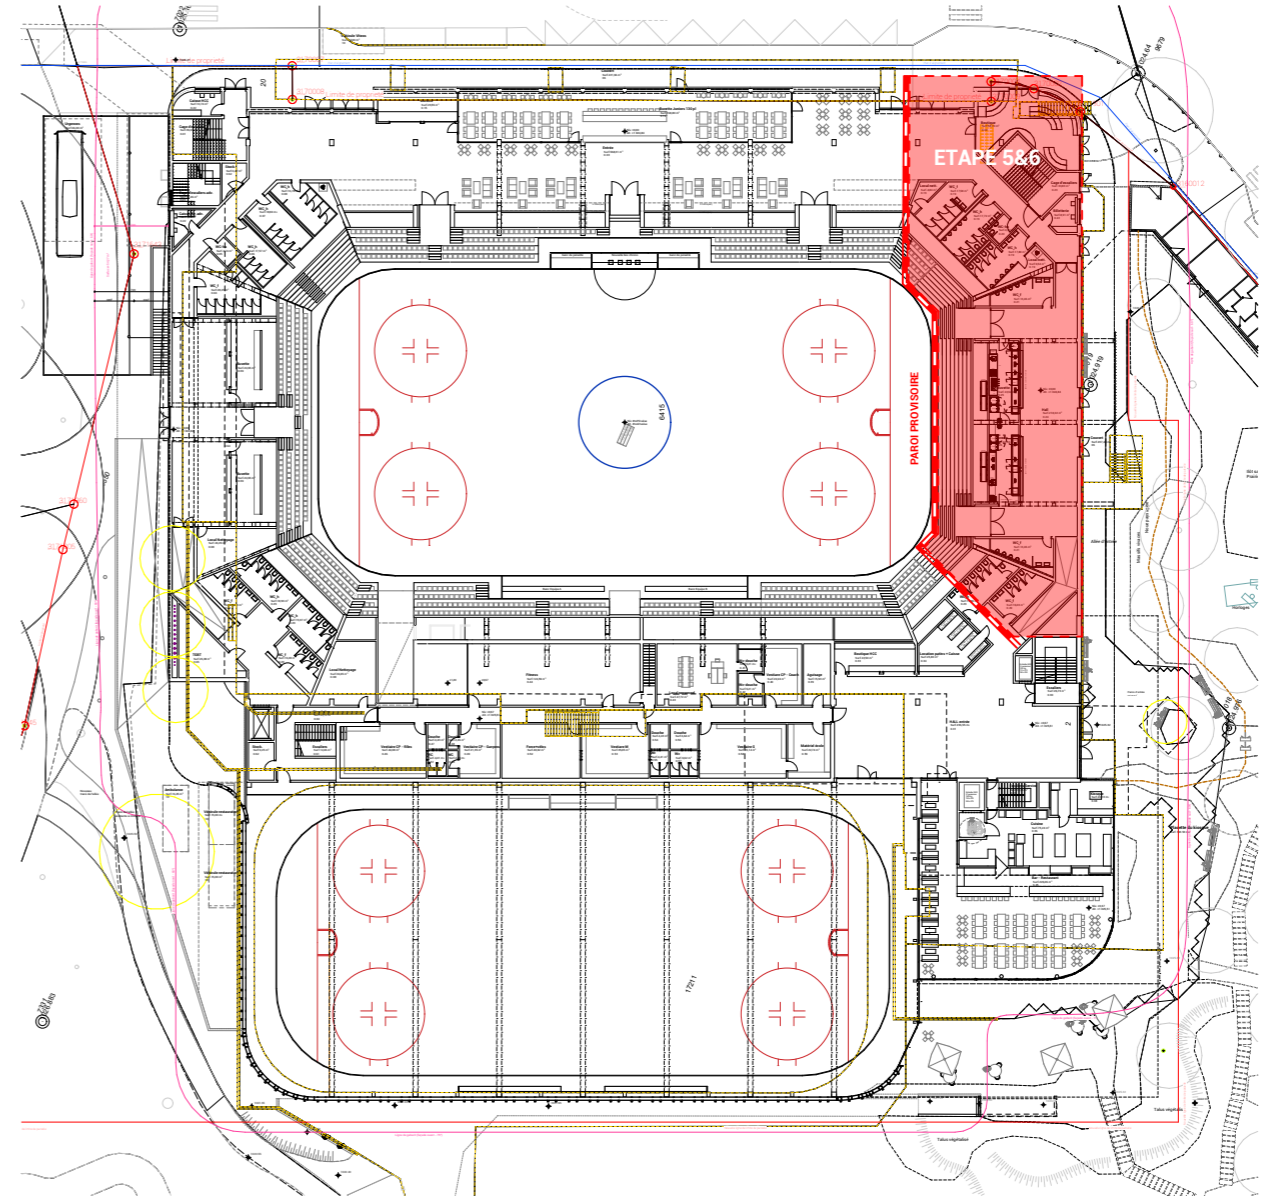

**Coupes Longitudinales**

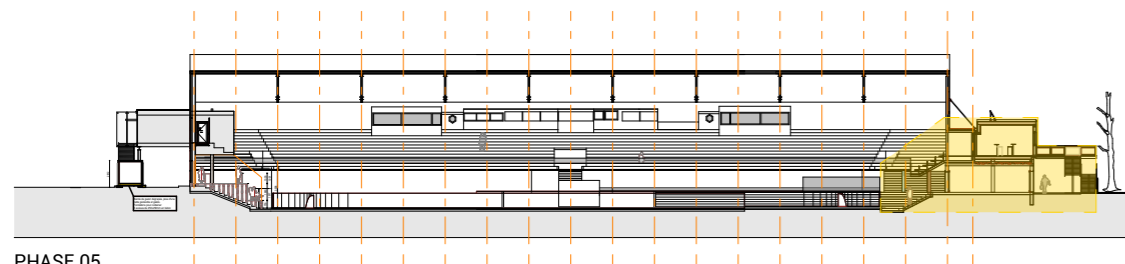

PHASE 05

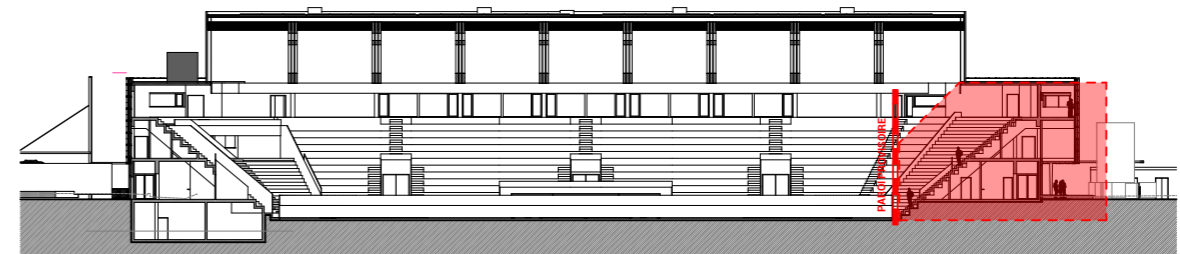

PHASE 06


CONFIGURATION INITIALE

**CAPACITE SPECTATEURS 5225 pl**

dont 1200 assis et 4025 debout

Existant  
Assis 1200pl  
Debout 4025pl

Nouveau  
-

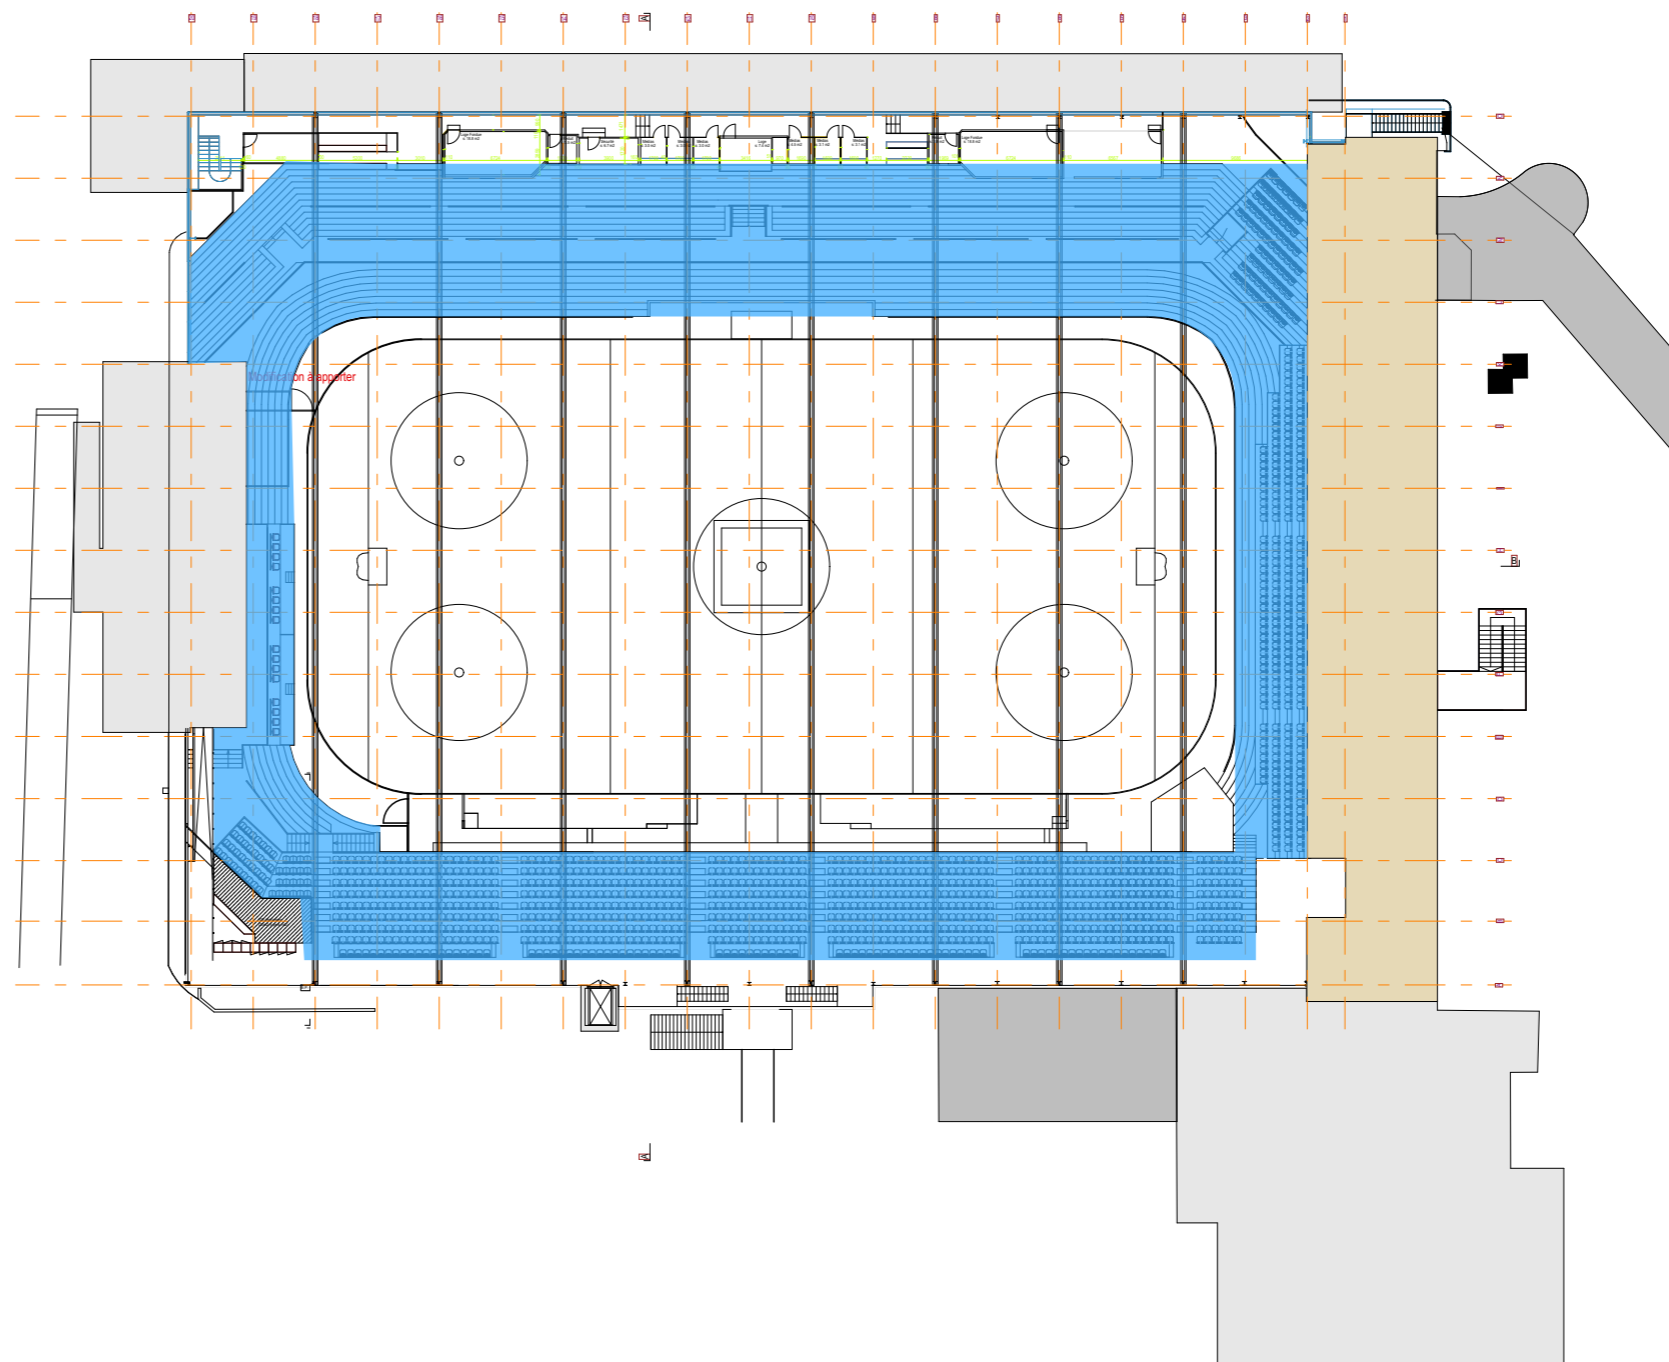


PHASE 01

**CAPACITE SPECTATEURS 3940 pl**

dont 700 assis et 2900 debout

Existant  
Assis 700pl  
Debout 2900pl

Nouveau  
-

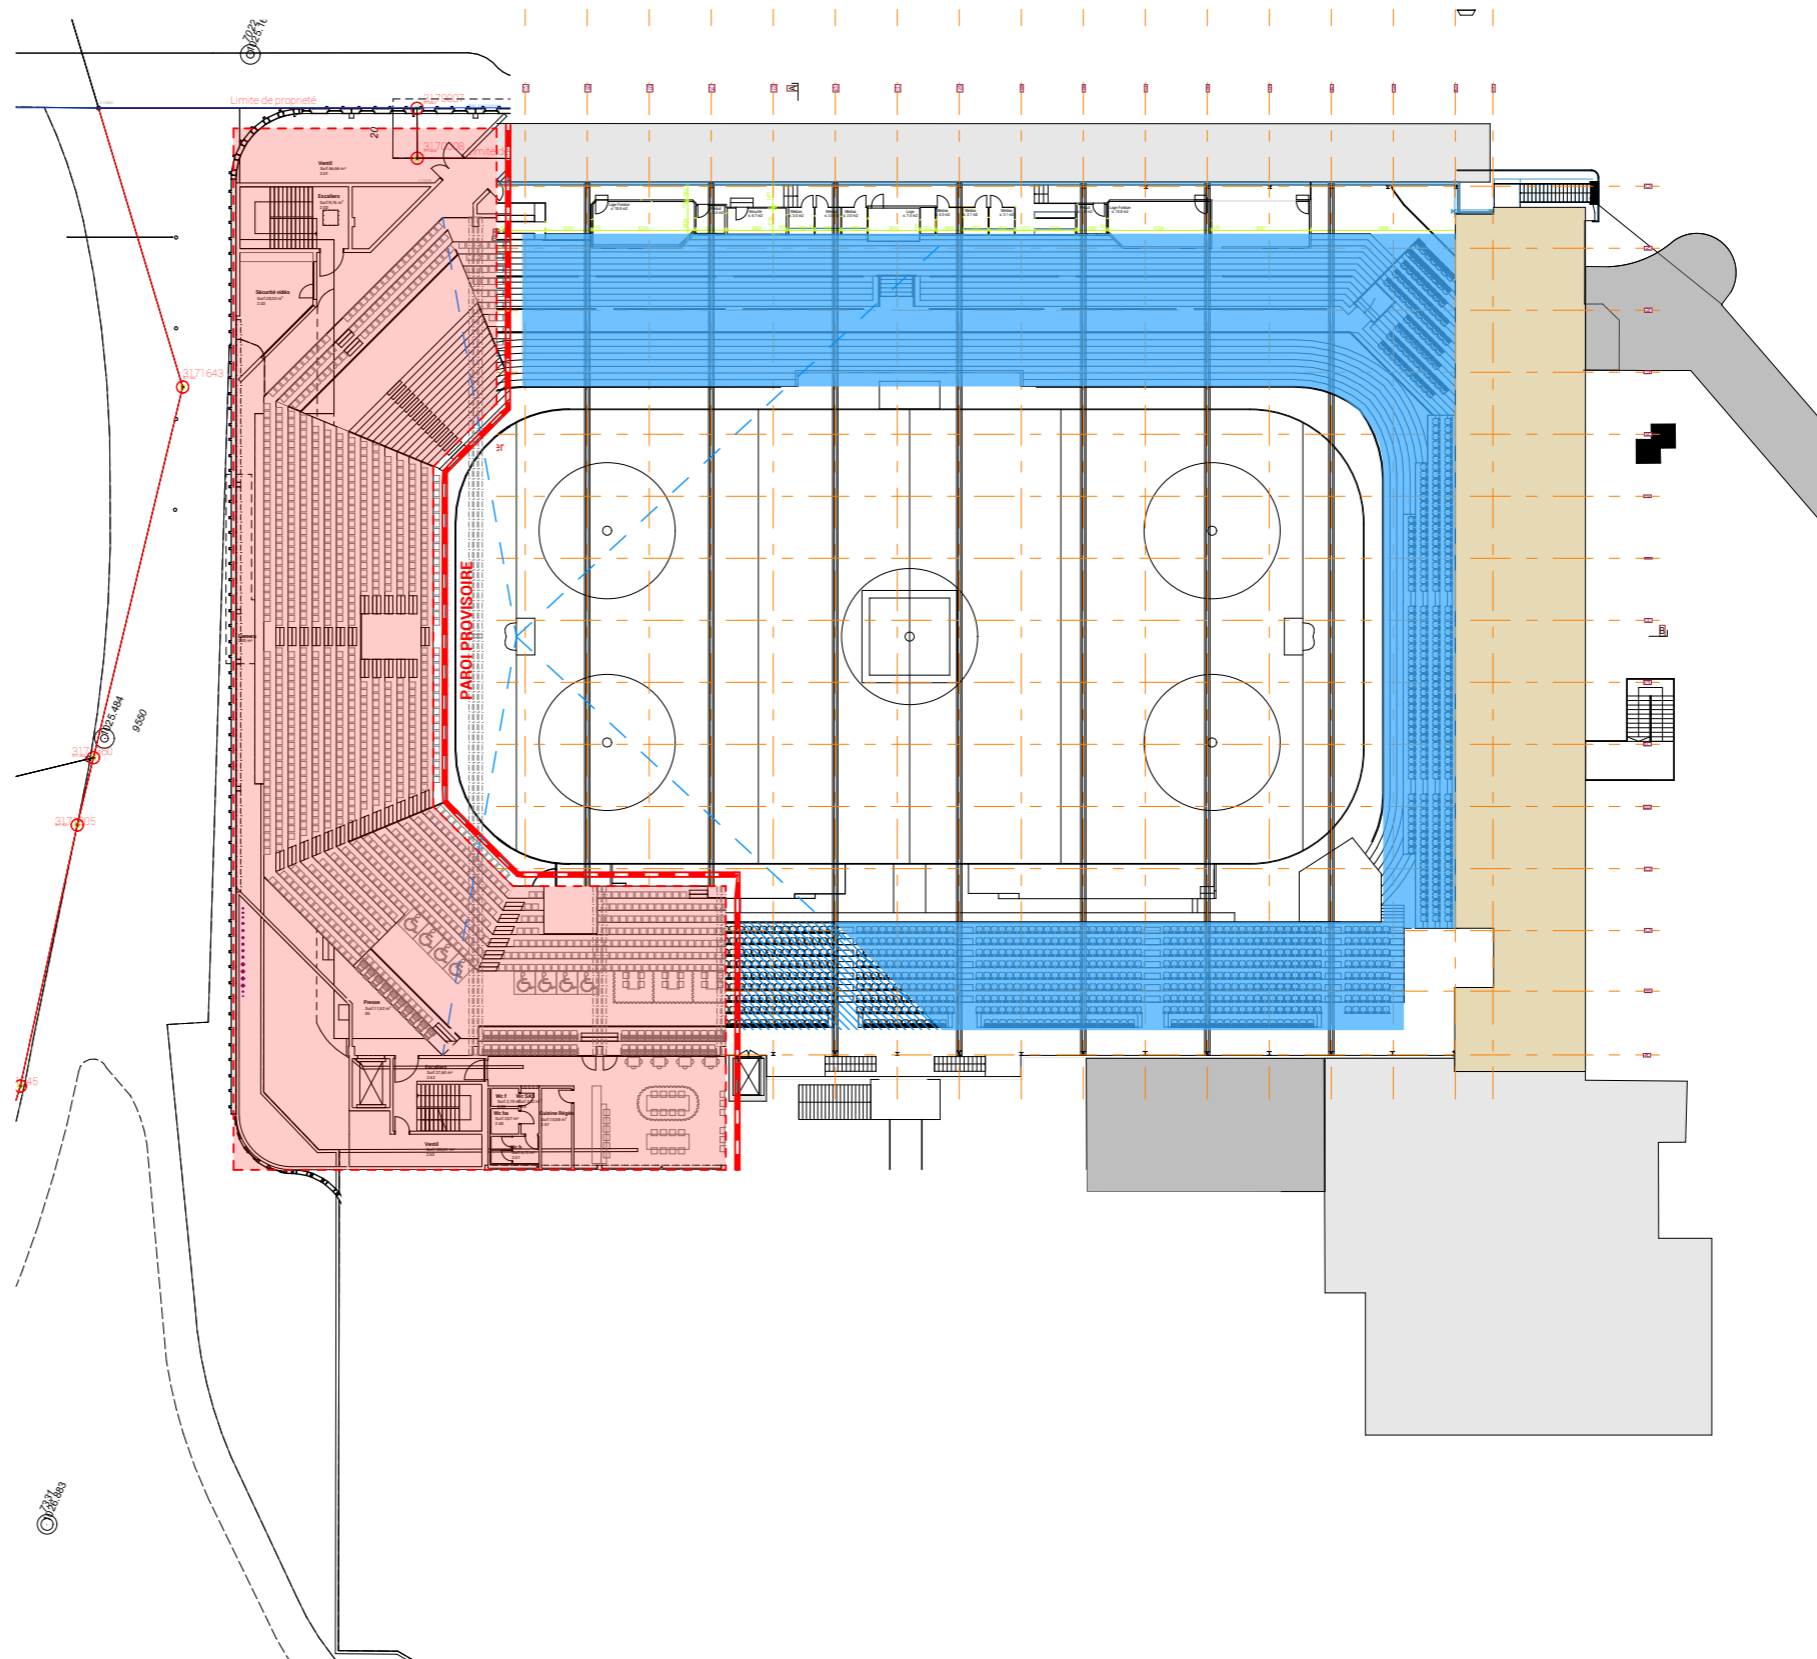


PHASE 02a

**CAPACITE SPECTATEURS 4260 pl**

dont 1370 assis et 2900 debout

Existant  
Assis 270pl  
Debout 2640pl

Nouveau  
Assis 1100pl  
Debout 260pl

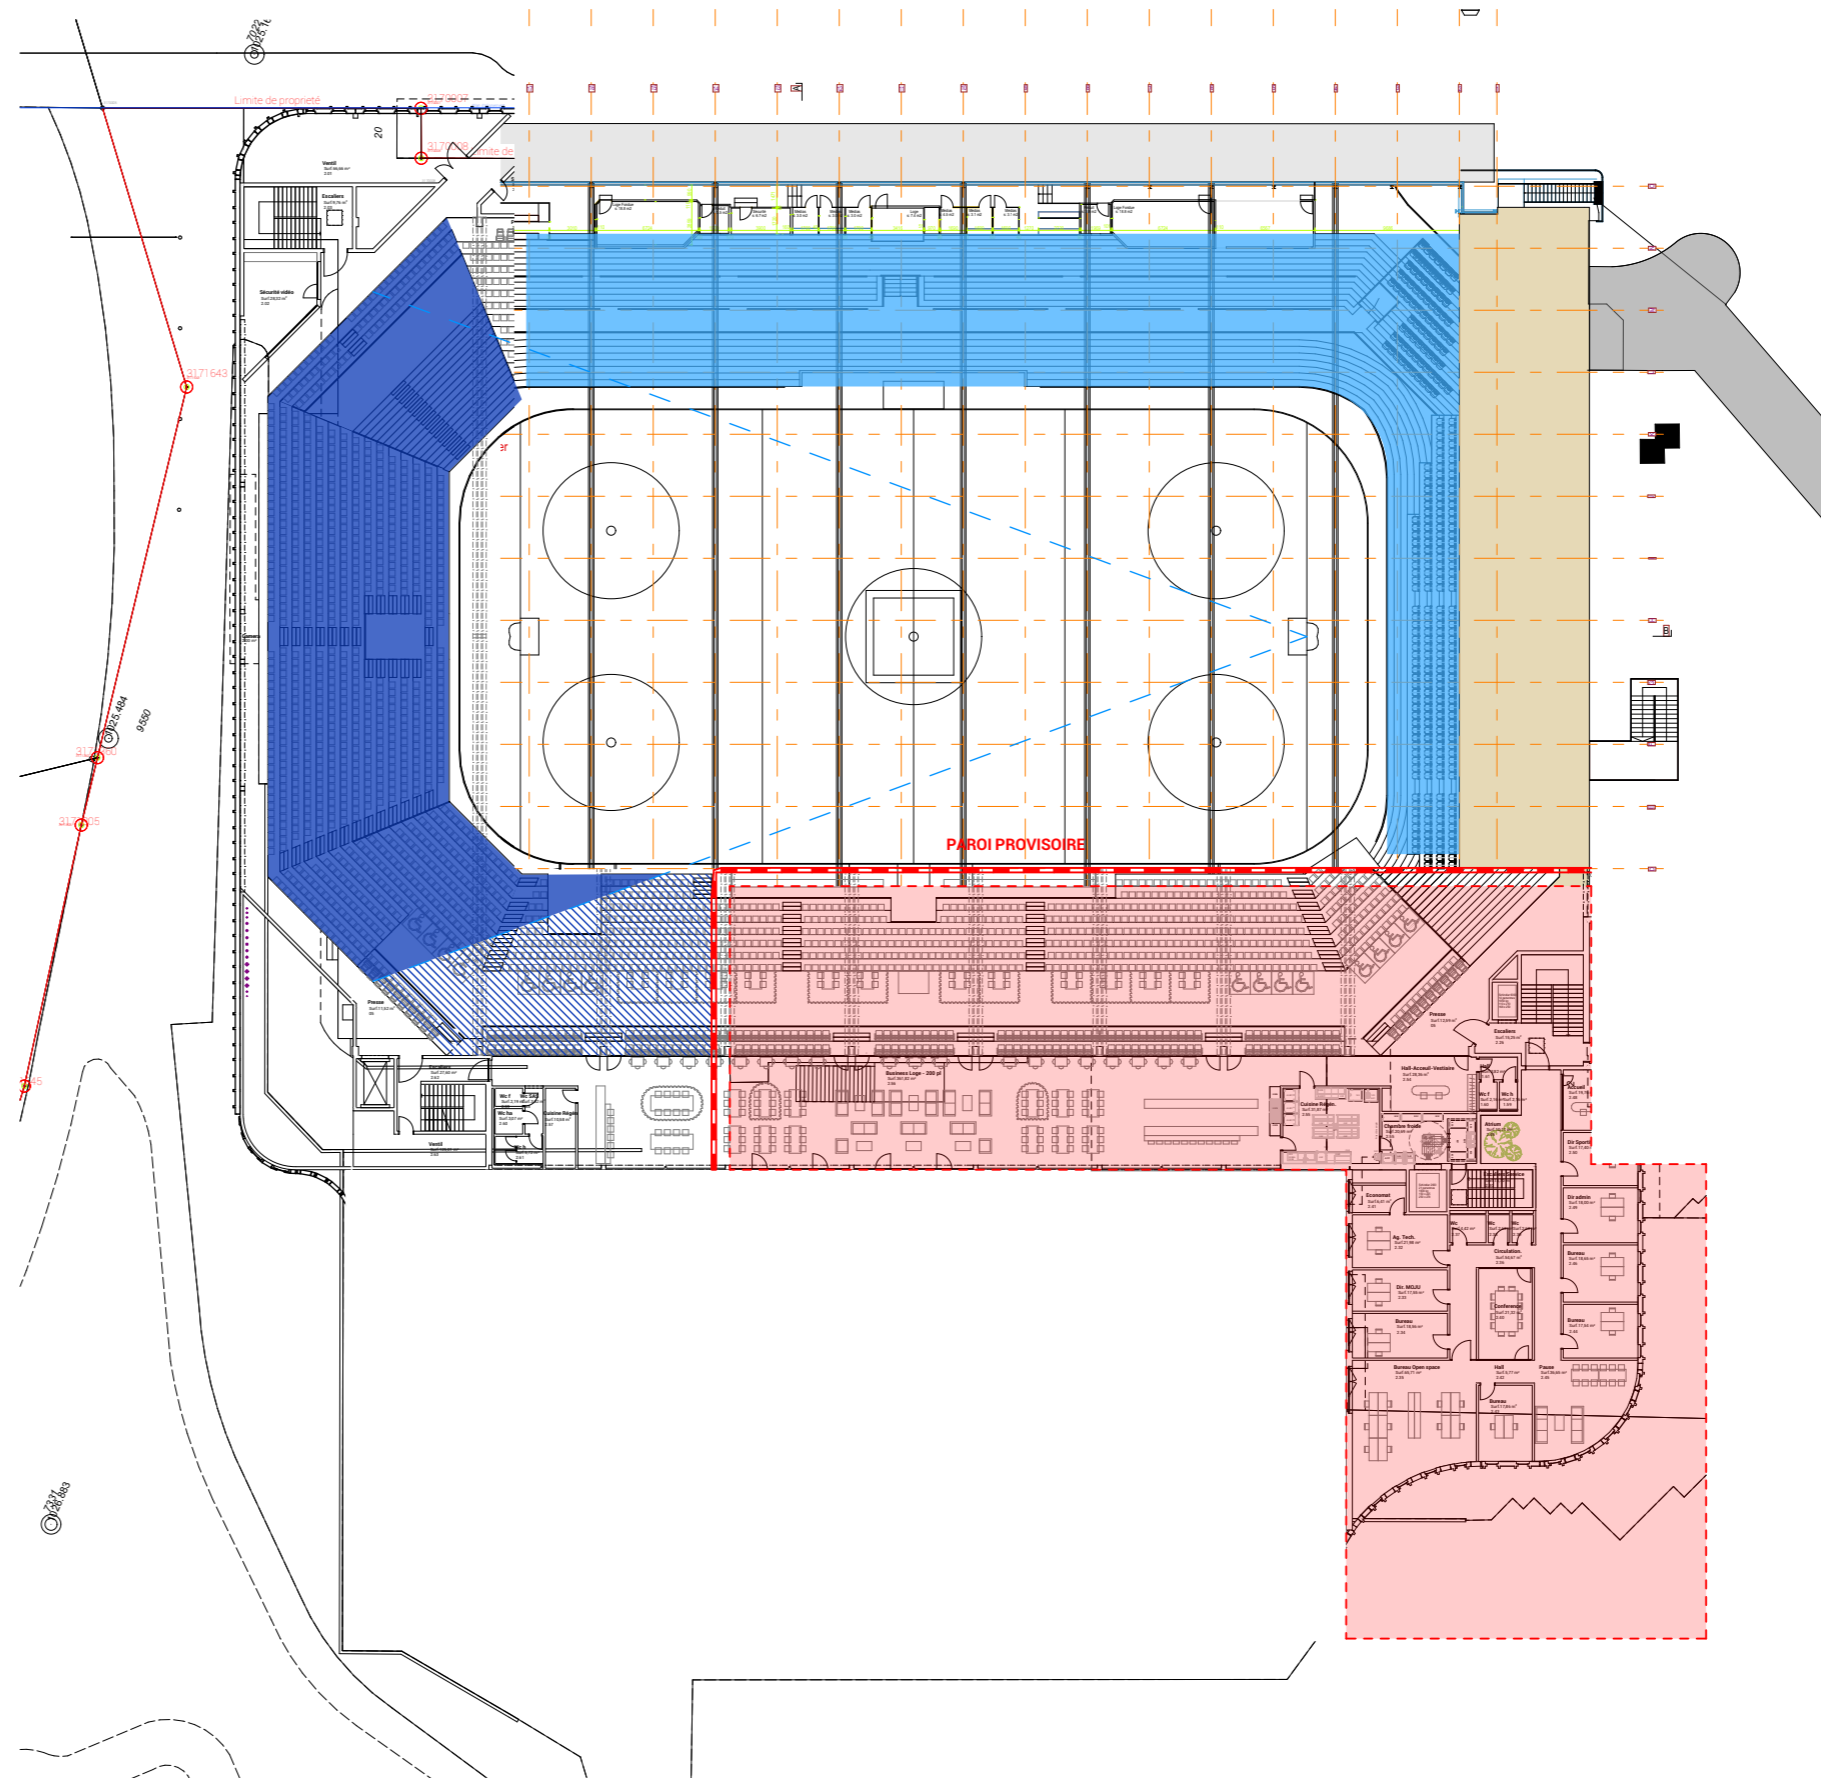

PHASE 02b


**\*CAPACITE SPECTATEURS 3550 pl**

dont 3290 assis et 260 debout

Existant  
Assis 190pl

Nouveau  
Assis 3100pl  
Debout 260pl

\*Les tribunes seront terminées au cours de l'été 2025, de sorte qu'elles n'aient aucune incidence sur la capacité d'accueil pendant la saison de hockey.

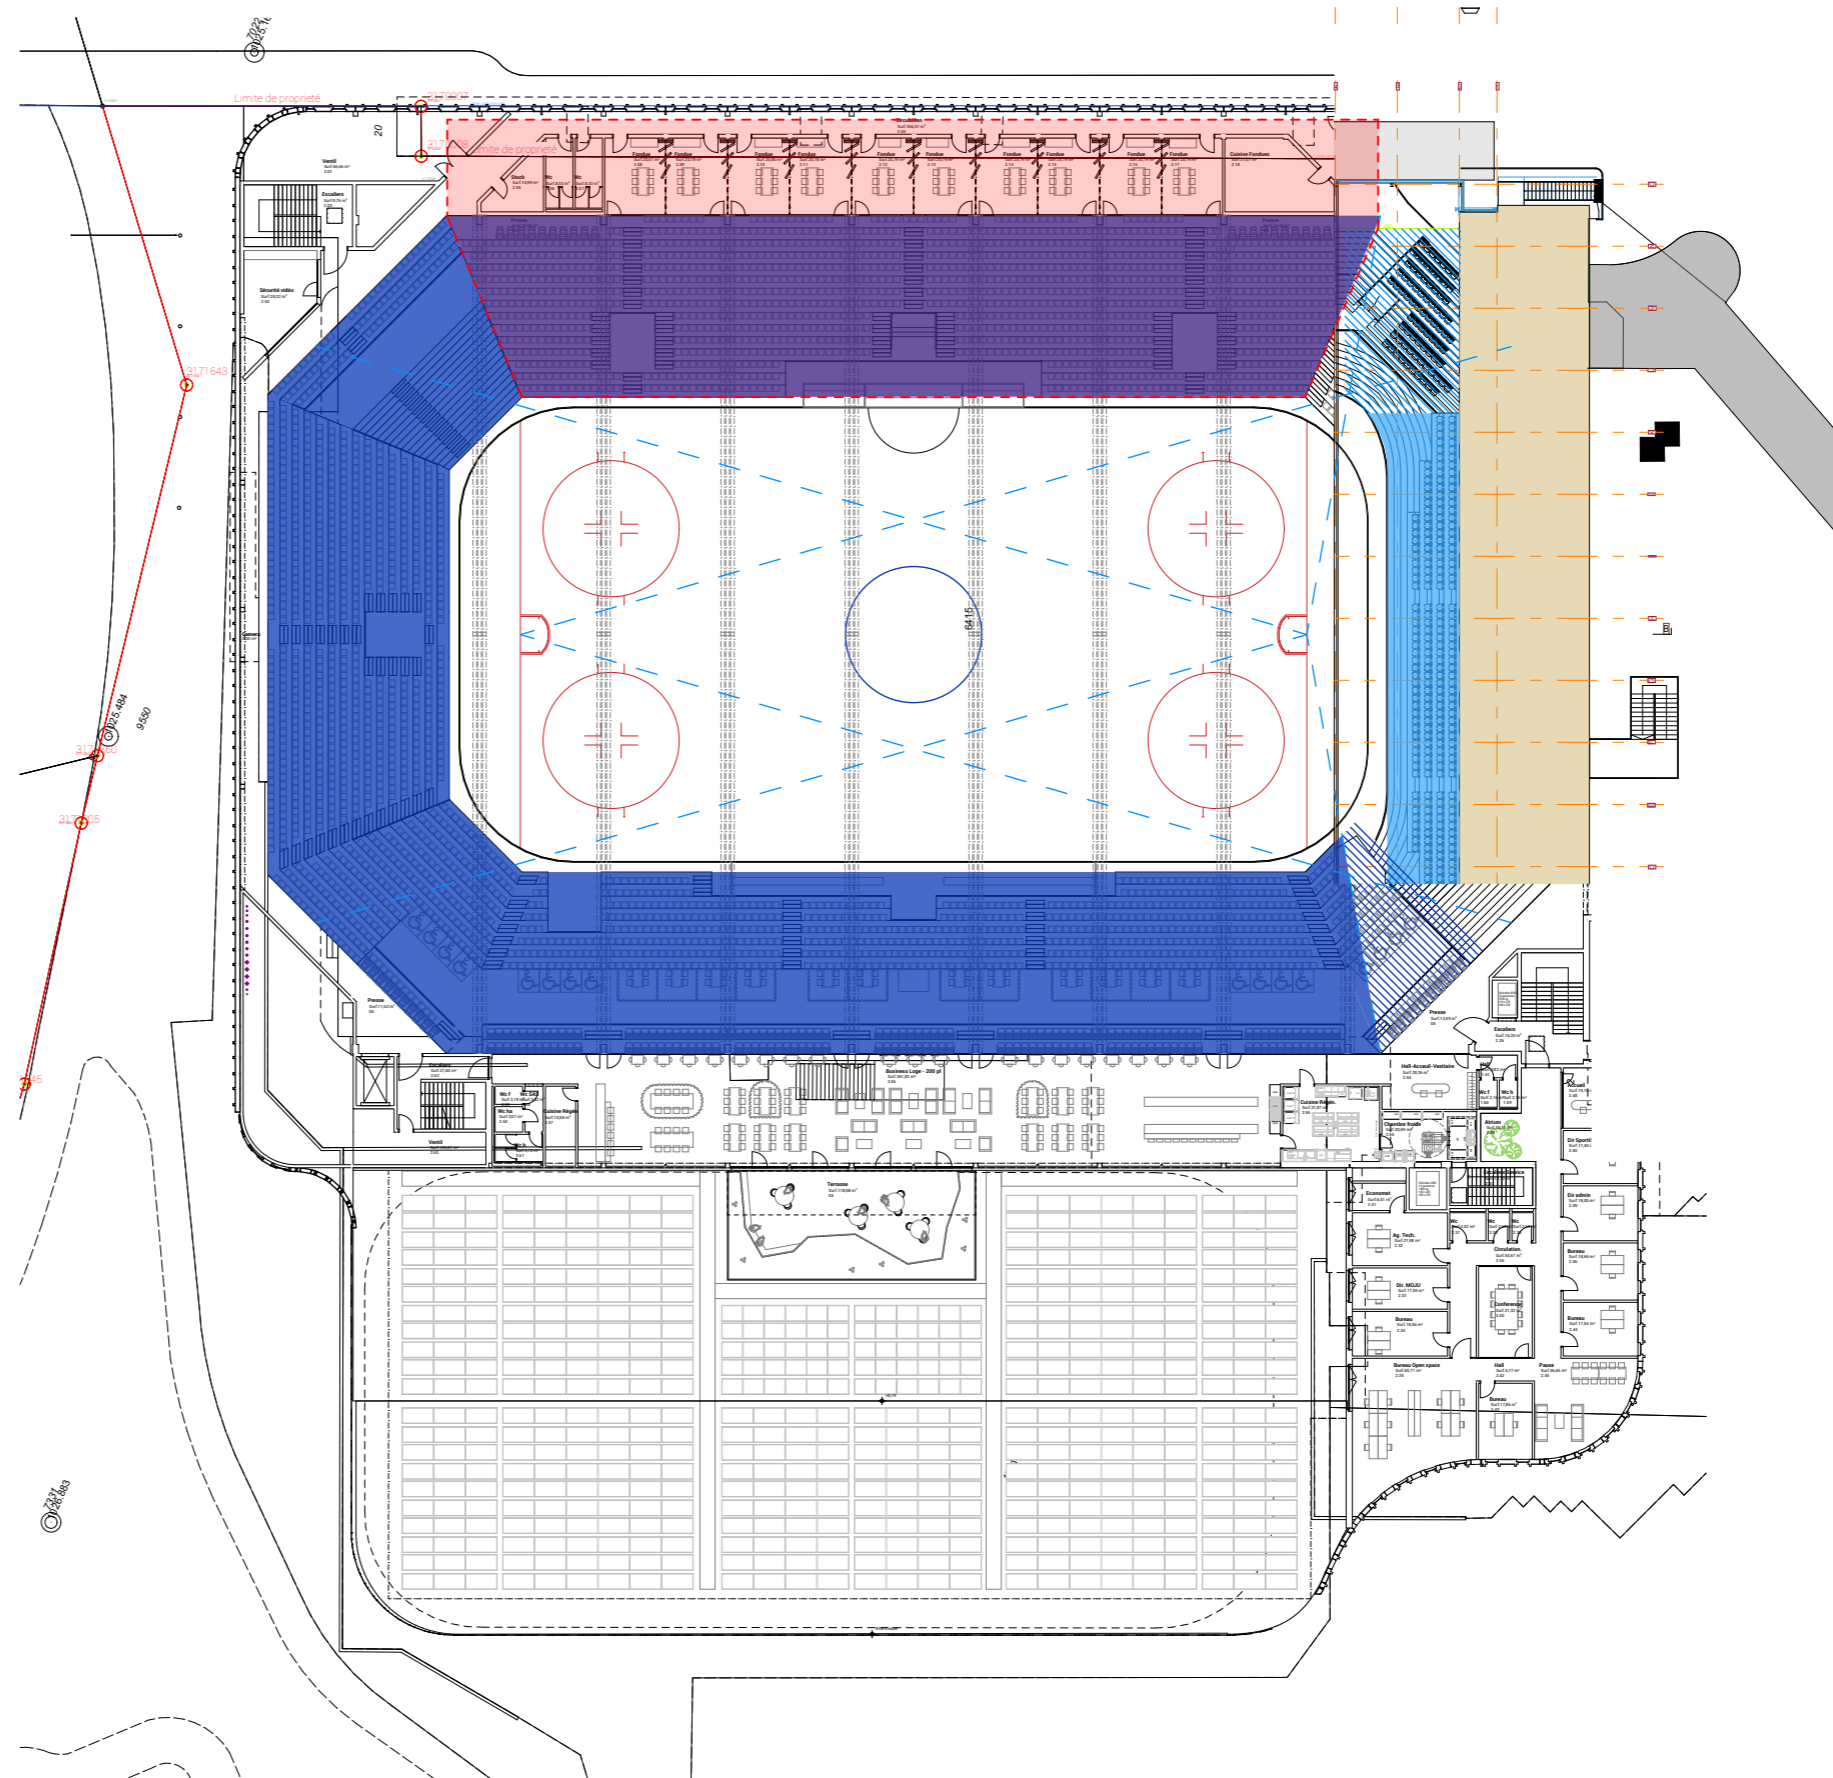


PHASE 03-04

**CAPACITE SPECTATEURS 3550 pl**

dont 3290 assis et 260 debout

Existant  
Assis 190pl

Nouveau  
Assis 3100pl  
Debout 260pl

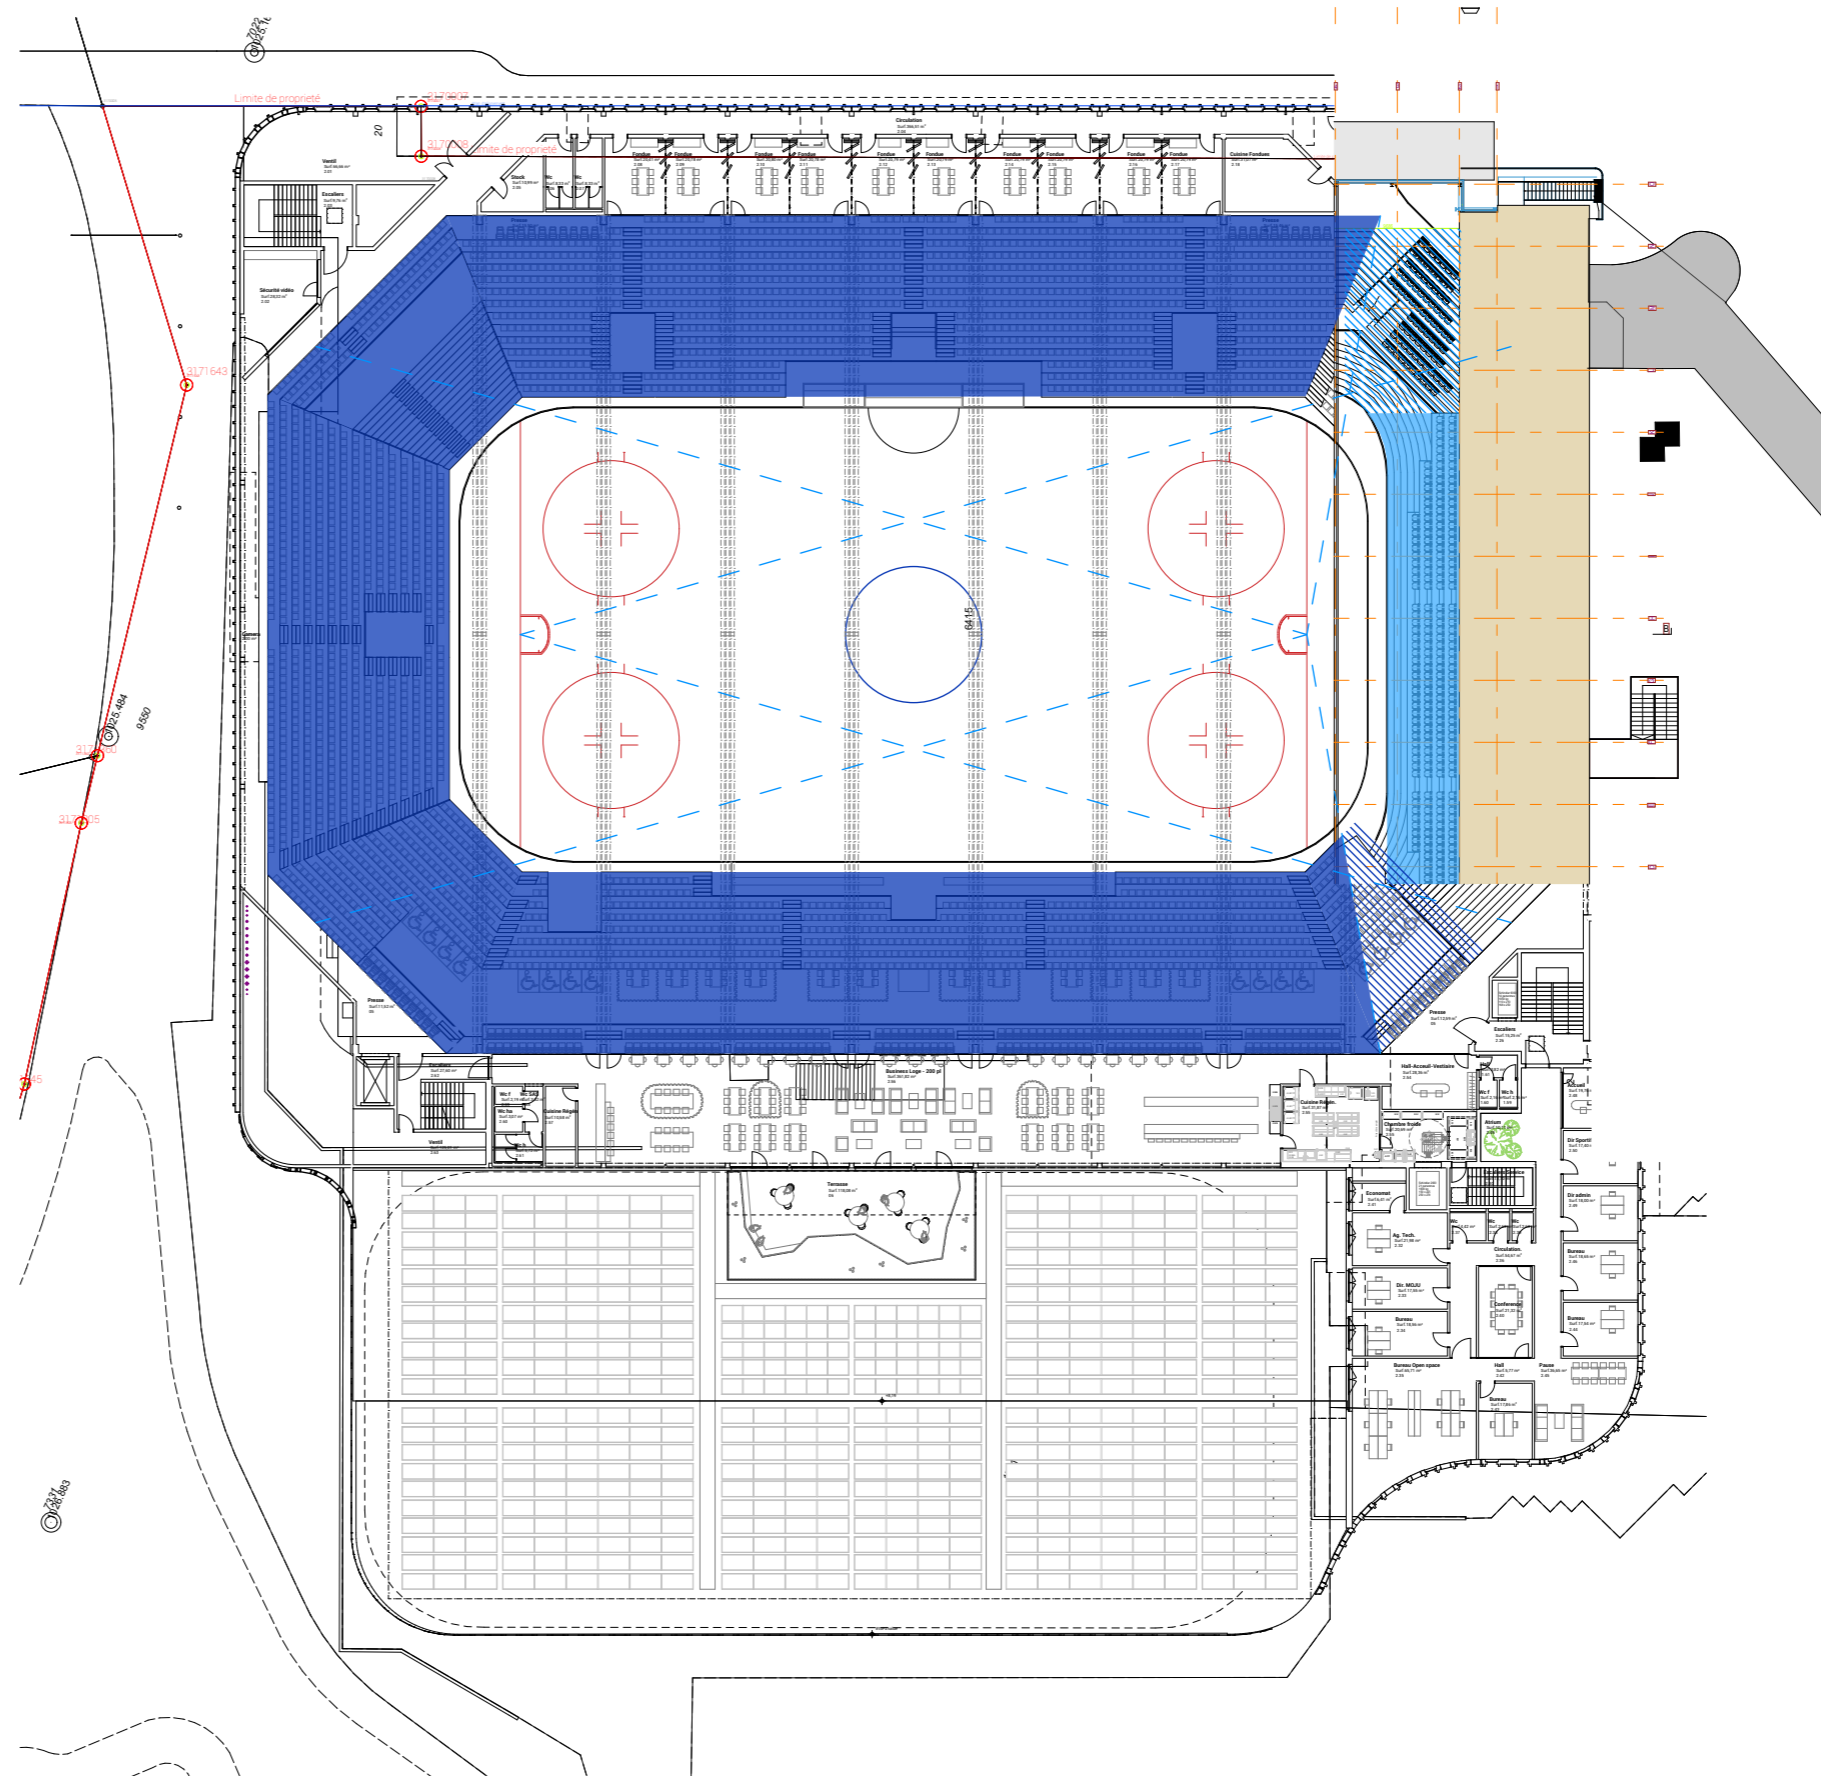


PHASE 05-06

**CAPACITE SPECTATEURS 3360 pl**

dont 3100 assis et 260 debout

Existant -

Nouveau  
Assis 3100pl  
Debout 260pl

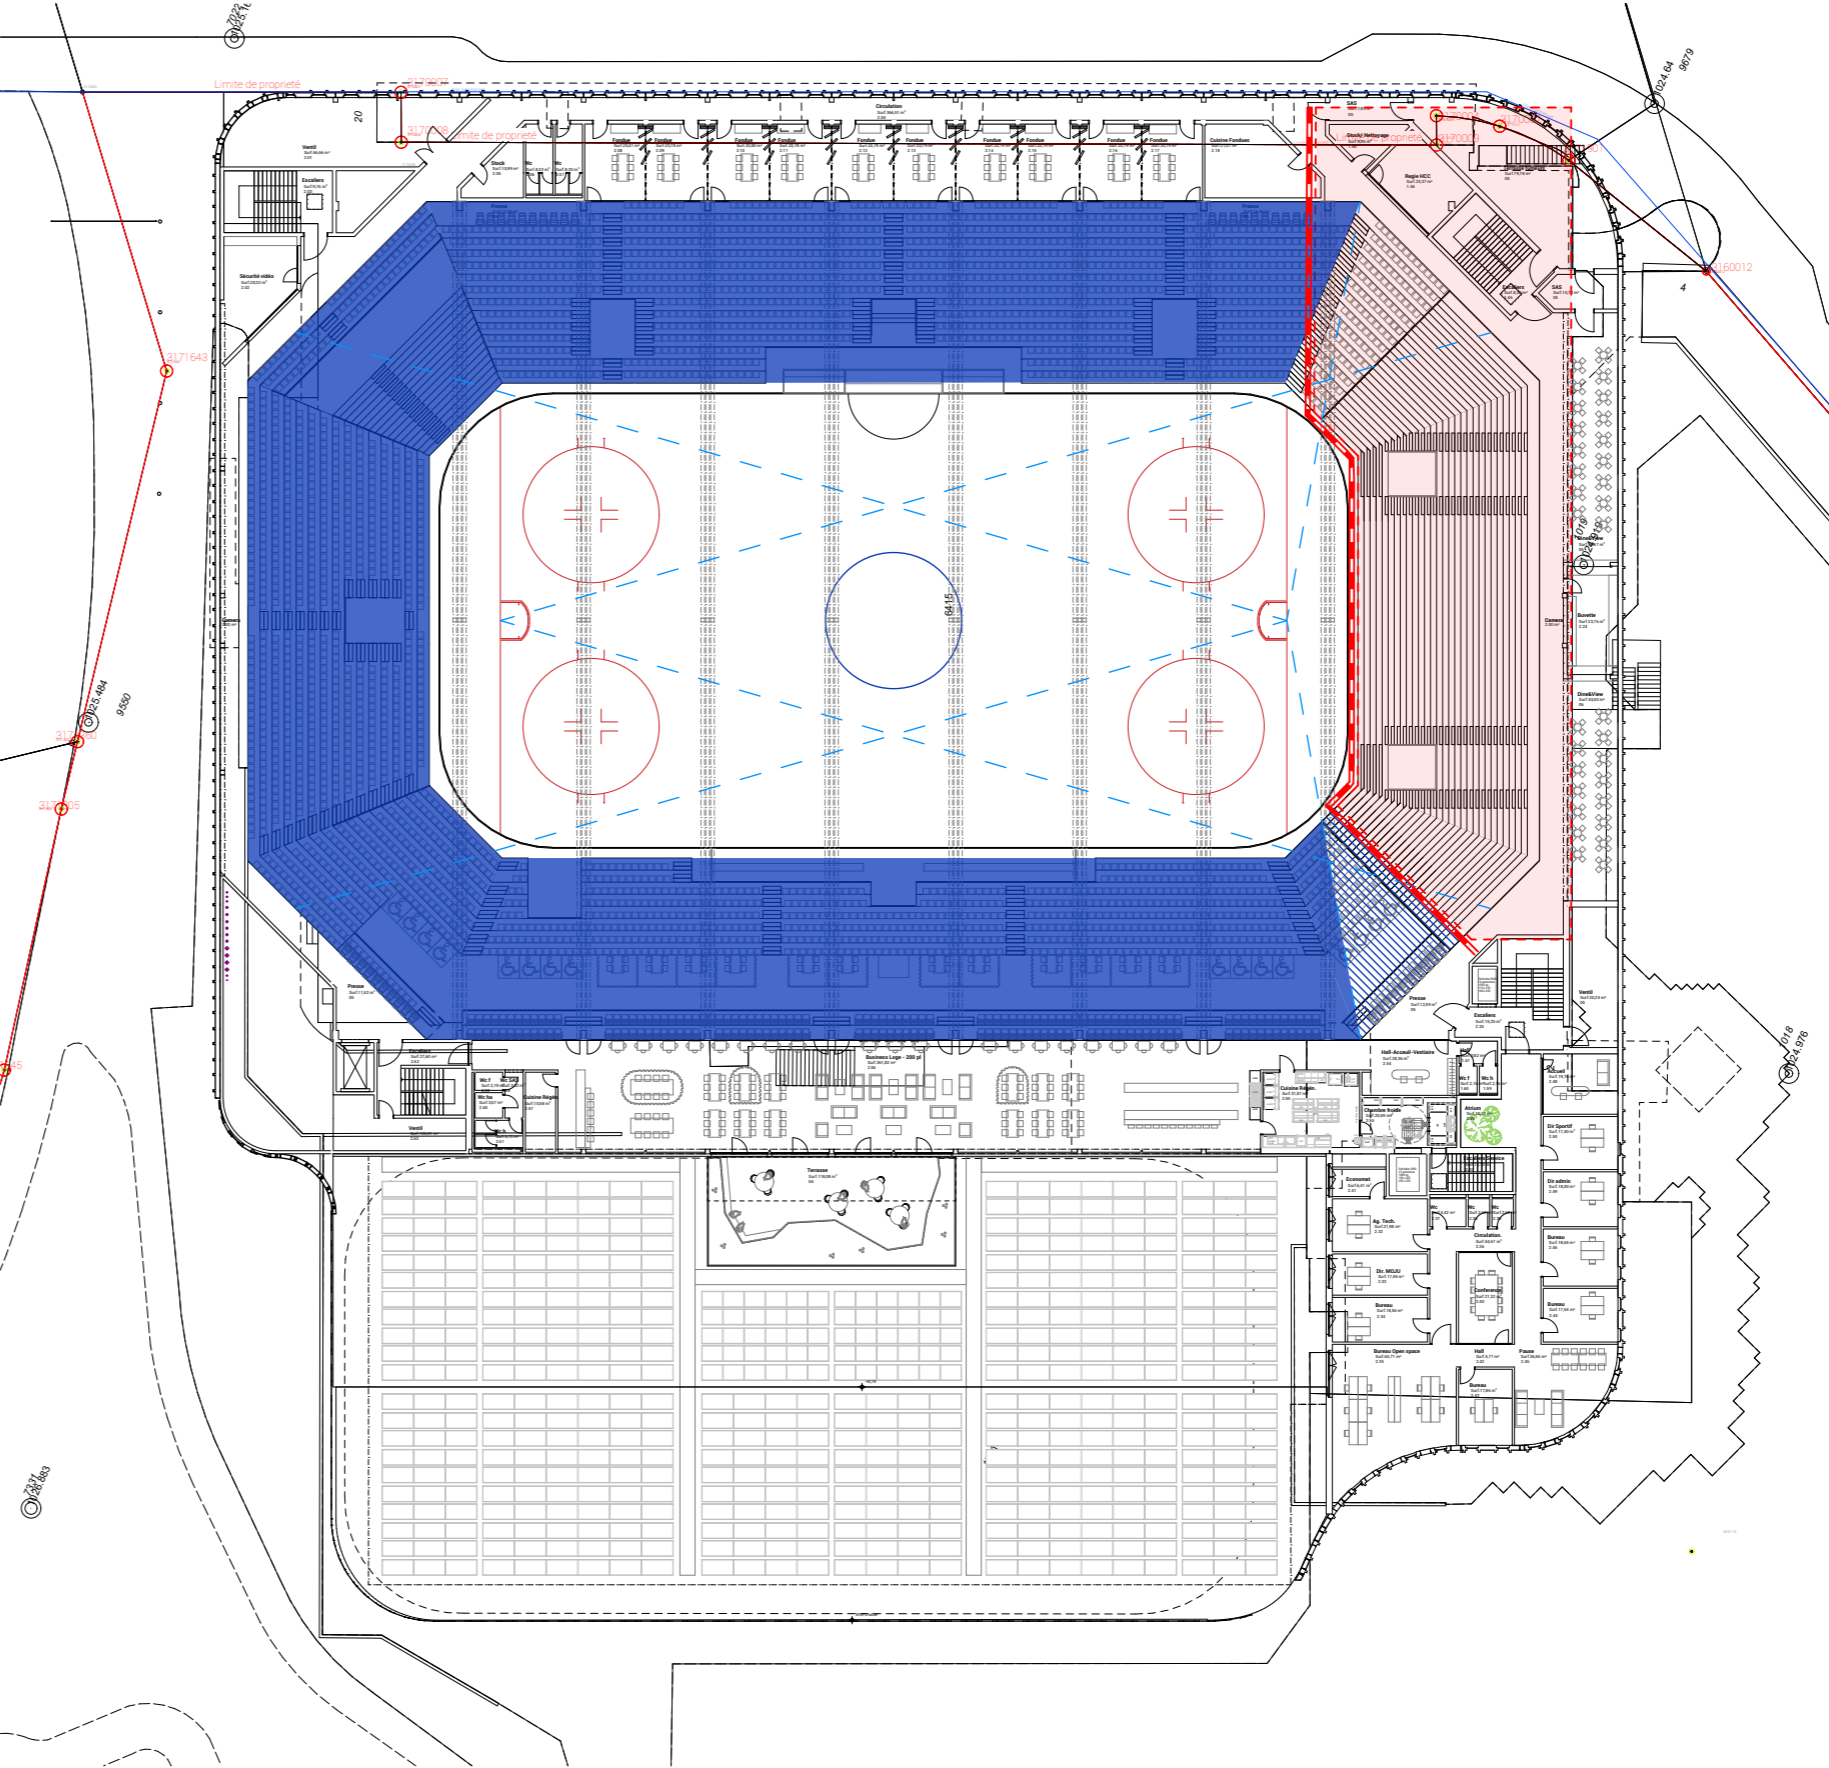

CONFIGURATION FINALE

**CAPACITE SPECTATEURS 5880 pl**

dont 3550 assis et 2330 debout

Existant

Nouveau

Assis 3550pl

Debout 2330pl

